

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成31年 3月25日 (月)

2 確認箇所

大型廃棄物保管庫建設予定地 (5, 6号機北西側の造成地)

3 確認項目

大型廃棄物保管庫建設予定地における追加ボーリング調査の実施状況


4 確認結果の概要

敷地北西側の造成地において建設が予定されている大型廃棄物保管庫[※]の詳細設計に向けて、追加のボーリング調査が行われていることから実施状況を確認した。

- ・追加ボーリング調査は、建屋予定地6カ所及び建屋予定地西側2カ所の計8カ所で予定されているが、これまでに建屋予定地の3カ所が終了し、建屋予定地の北西側で4カ所目のボーリングが行われていた。

(写真1、写真2)

※ 大型廃棄物保管庫：汚染水処理装置（セシウム吸着装置等）から発生する二次廃棄物（使用済吸着塔）など、大型で重量のある廃棄物を保管する施設

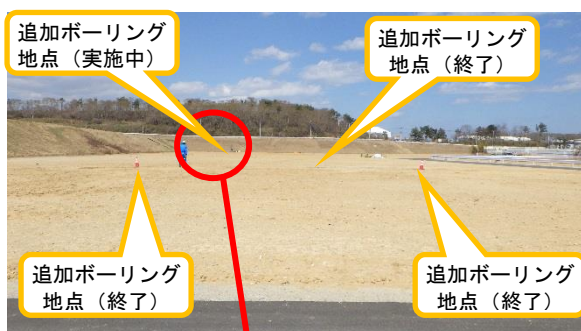

(写真1-1)

大型廃棄物保管庫建設予定地の状況 (南側から撮影)



(写真1-2)

実施中の追加ボーリング地点の状況 (南東側から撮影)



(写真2)
追加ボーリング地点の作業状況

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。
