

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
平成31年4月8日（月）
- 2 確認箇所
3号機タービン建屋逆洗弁ピット周り（3号機タービン建屋東側）
- 3 確認項目
3号機タービン建屋逆洗弁ピット周りヤード整備工事の進捗状況
- 4 確認結果の概要

3号機タービン建屋東側の逆洗弁ピット周りにおいて、放射線量の低減を図るとともに、3号機タービン建屋屋根面対策工事のためのクレーンヤードを整備する工事（逆洗弁ピットの覆工、前面道路の嵩上げ及びアスファルト舗装）が昨年11月から行われていることから進捗状況を確認した。

（前回確認：平成31年1月25日）


- ・前回確認時は、逆洗弁ピットへのコンクリート打設工事の途中であったが、6槽ある逆洗弁ピット全部へのコンクリート打設が終了し、砕石による埋め戻し工事が行われていた。（写真1）
- ・また、逆洗弁ピット前面（東側）において、道路を嵩上げするためのコンクリート基礎工事が行われていた。（写真2）



（写真1－1）逆洗弁ピット覆工の状況①（北側から撮影）
（前回撮影）（今回撮影）



(写真1-2) 逆洗弁ピット覆工の状況② (南東側から撮影)
(前回撮影) (今回撮影)

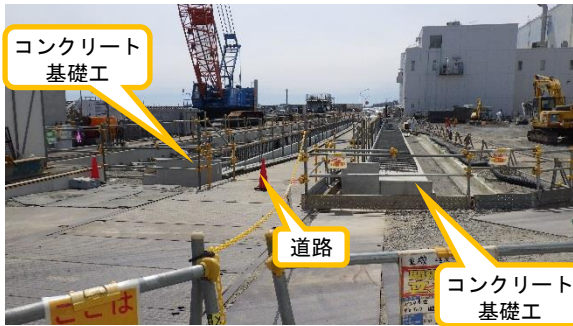

(写真2)
道路嵩上げ工の状況
(北側から撮影)

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。
