


福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
令和元年11月12日（火）
- 2 確認箇所
G4南タンクエリア
- 3 確認項目
G4南タンクエリアにおけるタンクリプレース工事の進捗状況

4 確認結果の概要

平成30年9月中旬から工事が着手されたG4南タンクエリアにおけるタンクリプレース工事の進捗状況を確認した。（前回確認：[平成31年4月9日](#)）

- ・G4南タンクエリアは敷地南東側に位置し、17基のフランジ型タンクが設置されていたエリアであり、タンクリプレースにより26基の溶接型タンクが設置される予定である。（図1）
- ・前回確認時、フランジ型タンクは解体済みであり、タンク基礎の解体に向けて堰内の除染作業が行われていたが、今回確認時、堰内の除染やタンク基礎の解体は終了しており、地盤改良作業や新たなタンク基礎の構築が行われていた。（写真1）

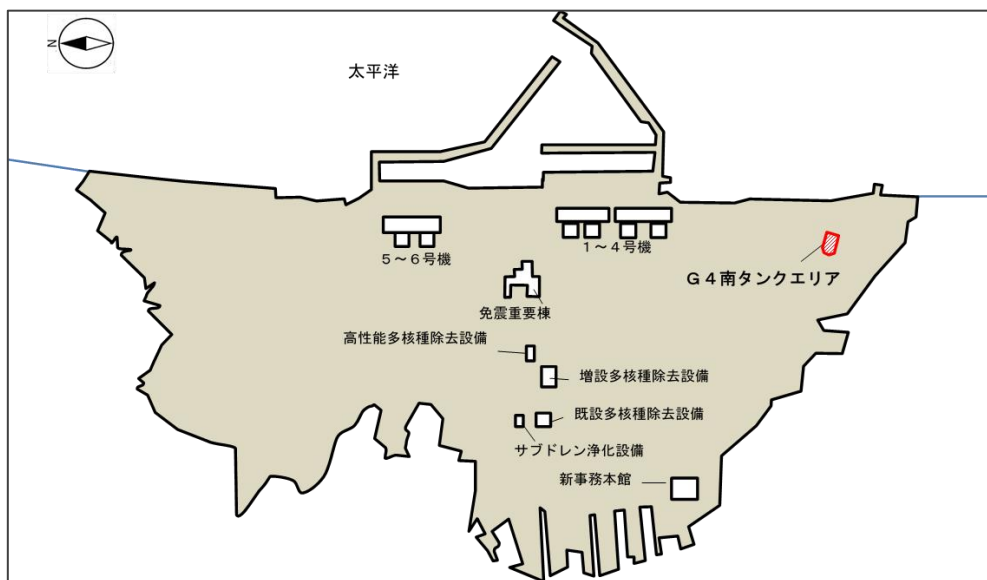

(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)
G4南タンクエリア全景



(写真1-2)
タンク基礎構築のため地盤改良中の
箇所



(写真1-3)
新たに構築されたタンク基礎



(写真1-4)
構築中のタンク基礎

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。
