

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

令和2年7月15日（水）

### 2 確認箇所

- ・ 2号機原子炉建屋南側
- ・ 共用プール建屋西側


### 3 確認項目

2号機燃料取り出し用構台設置に向けた準備工事の進捗状況

### 4 確認結果の概要

2号機原子炉建屋使用済燃料プールからの燃料取り出しに向け、2号機原子炉建屋南側に燃料取り出し用構台（以下、「構台」という。）を設置する準備が行われている。令和2年3月までに構台設置に干渉する共用ボイラ建屋の解体が実施され、構台設置に向けた地盤改良工事に支障となる範囲の埋設物の撤去等が行われていることから状況を確認した。

- ・ 2号機原子炉建屋南側では重機を用いた地盤掘削作業並びに掘削した土砂の運搬作業が行われていた。（写真1）
- ・ 共用プール建屋西側には汚染土等コンテナ詰めヤードが設置され、フレキシブルコンテナバッグに詰められた碎石やアスファルト等が仮置きされていた。（写真2）

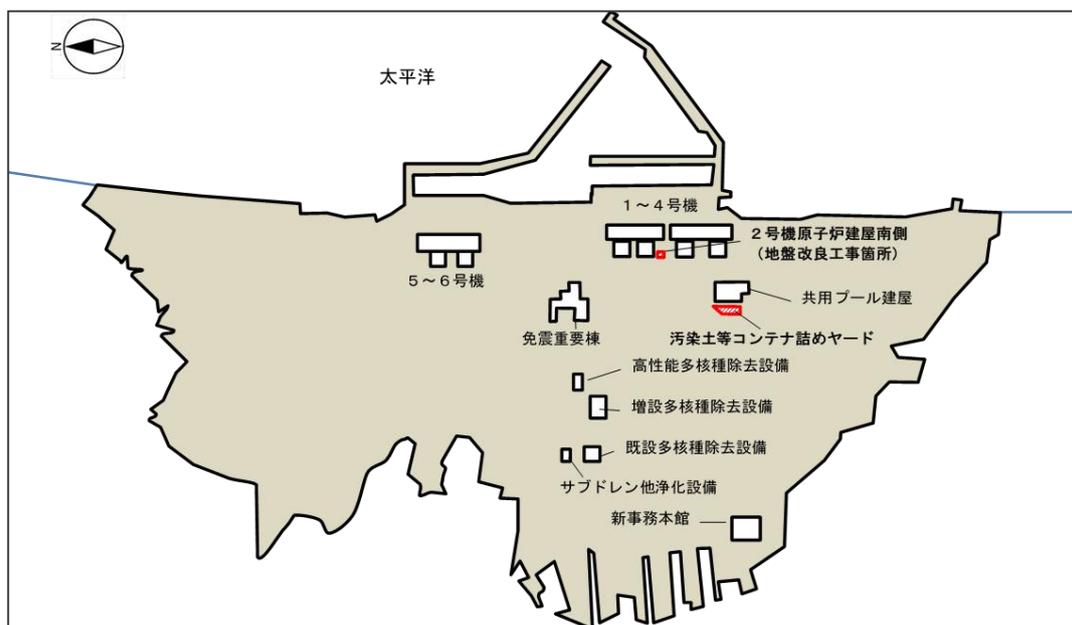

(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)  
地盤掘削作業の状況



(写真1-2)  
掘削した土砂の運搬作業の状況



(写真2)  
汚染土等コンテナ詰めヤードの状況

- 5 プラント関連パラメータ等確認  
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。
