


福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
令和2年4月9日（木）
- 2 確認箇所
メガフロート（1～4号機取水路開渠内）
- 3 確認項目
メガフロート津波等リスク低減対策工事の進捗状況

4 確認結果の概要

メガフロート津波等リスク低減対策工事は3月4日からステップ2としてメガフロートの着底作業が開始され、4月3日からメガフロート内部へのモルタル充填が開始されていることから状況を確認した。（前回確認：[令和2年3月30日](#)）（図1）

- ・工事用車両が東波除堤からメガフロートに進入するための仮栈橋が完成しており、ミキサー車が仮栈橋を渡り、メガフロート上に開けられたモルタル充填口からモルタルを充填していた。（写真1）
- ・メガフロート北側の港湾内には、汚濁防止フェンスが設置されていた。（写真2）

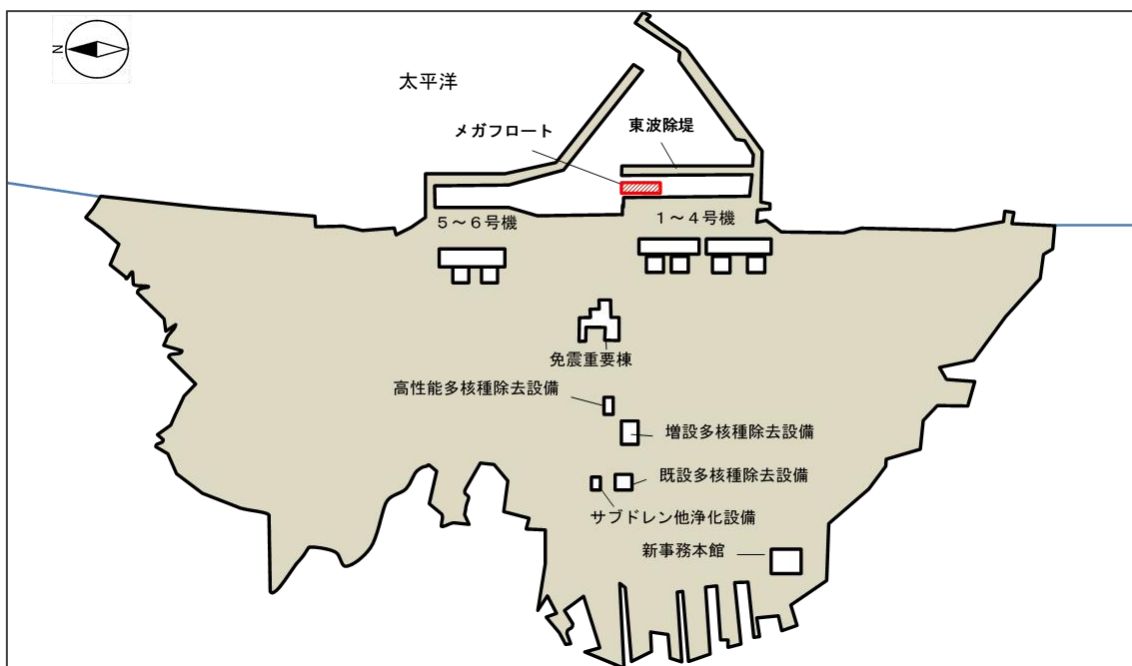

（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)
仮棧橋を渡っているミキサー車



(写真1-2)
メガフロートへのモルタル充填作業
の状況



(写真2)

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。
