

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和2年9月11日（金）

2 確認箇所

- ・ 2号機原子炉建屋南側
- ・ 6号機北西側

3 確認項目

2号機燃料取り出し用構台設置に向けた準備工事の進捗状況

4 確認結果の概要

2号機原子炉建屋使用済燃料プールからの燃料取り出しに向け、2号機原子炉建屋南側では、燃料取り出し用構台（以下、「構台」という。）を設置する準備が行われており、現在、構台設置に向けた地盤改良工事に支障となる範囲の干渉物撤去工事が実施されている。また、2号機原子炉建屋南側から撤去したガレキや汚染土は今後、コンテナへ詰め込み、6号機北西側で仮保管（令和2年10月～令和3年6月下旬）する運用になったことから2号機原子炉建屋南側及び6号機北西側の仮保管予定地の現状を確認した。（前回確認：[令和2年7月15日](#)）（図1）

- ・ 2号機原子炉建屋南側では配管の撤去作業が行われていた。（写真1）
- ・ 2号機原子炉建屋南側のコンテナ詰めエリアについては確認時、作業は行われていなかった。（写真2）
- ・ 6号機北西側の詰め済コンテナ仮保管エリア予定地の現状を確認したところ仮保管スペースが確保されている状態であった。（写真3）

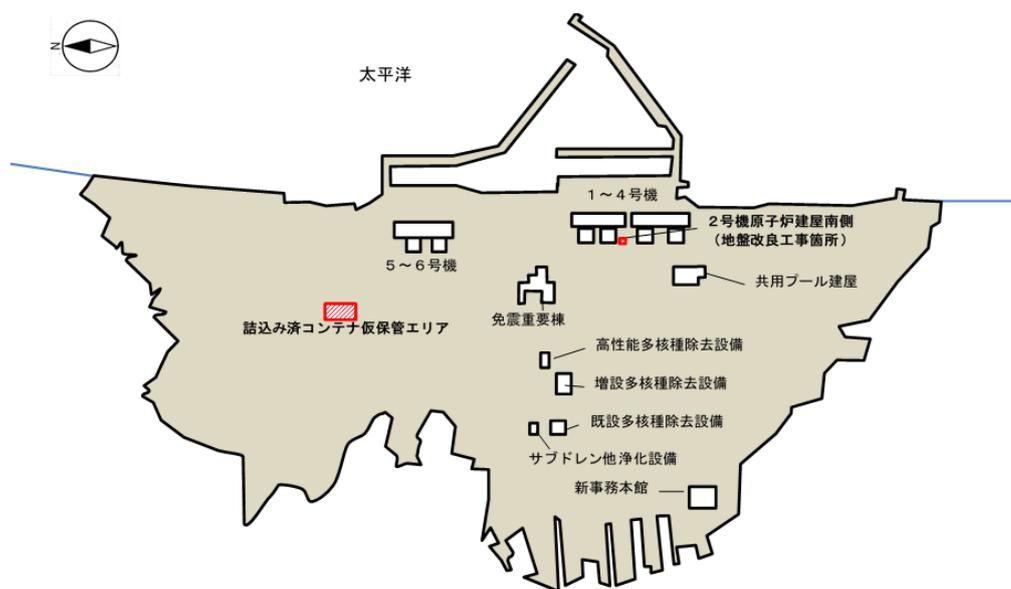


図1 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1)
2号機原子炉建屋南側の状況



(写真2)
2号機原子炉建屋南側のコンテナ詰めエリアの様子



(写真3)
6号機北西側の詰込み済コンテナ仮保管エリアの状況

(参考) 建設中の大型廃棄物保管庫

詰込み済コンテナ仮保管エリア

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。
