

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

令和3年10月14日（木）

### 2 確認箇所

1-4号サブドレン他集水設備移設予定箇所（ろ過水タンク西側）


### 3 確認項目

1-4号サブドレン他集水設備移設予定箇所の整備状況

### 4 確認結果の概要

津波対策の一環として現在T.P.2.5m盤に設置している1-4号サブドレン他集水設備をT.P.33.5m盤に機能移転する工事のうち、移転予定先のろ過水タンク西側のエリア整備作業が令和3年7月から実施されていることから、作業の進捗状況を確認した。（図1、写真1）

- ・当該エリアの一部には敷き鉄板が敷かれ、工事用資機材やコンテナ等が置かれていたが、敷き鉄板や資機材の一部が撤去されていた。なお、現場確認時には廃棄物の運搬作業等が実施されていた。（写真2）
- ・東京電力が原子力保安検査官より当該エリア北西側に管理者不明のコンテナがあるとの指摘を受けていた（[令和3年5月25日](#)、[5月27日](#)に現地確認実施）が、当該コンテナの一部はエリア南側に移設され保管されていた。（写真3）
- ・東京電力によると、移転予定先のエリア整備作業は今年度中に終了し、その後、地盤改良工事を経て、令和5年初めまでに1-4号サブドレン他集水設備を移転する予定とのことである。

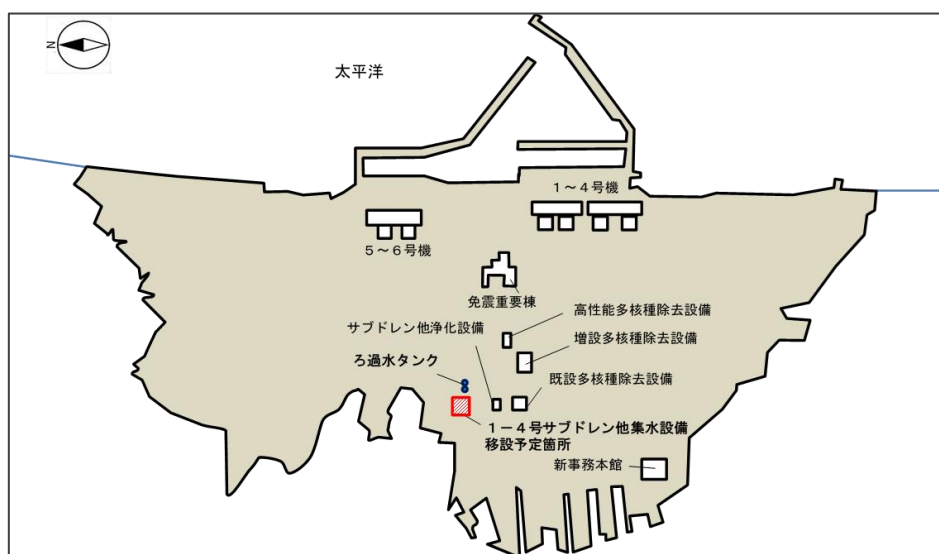

(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1)  
1-4号サブドレン他集水設備移設  
予定箇所の外観  
(南側から撮影)



(写真2-1)  
エリア整備作業開始前の状況  
(北西側から撮影)  
(令和3年5月25日撮影)



(写真2-2)  
エリア整備作業開始後の状況  
(北西側から撮影)  
(令和3年10月14日撮影)



(写真3-1)  
エリア整備作業開始前の管理者不明  
コンテナの保管状況  
(令和3年5月25日撮影)



(写真3-2)  
エリア整備作業開始後の管理者不明  
コンテナの保管状況  
(令和3年10月14日撮影)



(写真3-3)

エリア南側に移設された管理者不明  
コンテナの保管状況

(令和3年10月14日撮影)

5 プラント関連パラメータ等確認

本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。
