


福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
令和4年6月9日（木）
- 2 確認箇所
2号機原子炉建屋南側ヤード
- 3 確認項目
2号機燃料取出し用構台設置工事の進捗状況
- 4 確認結果の概要

2号機の燃料取出しについては、燃料取出し用構台設置後に原子炉建屋オペレーティングフロア南側に開口部を設け、燃料取扱設備を設置する計画であり、建屋内ではオペレーティングフロアの除染や遮へい体の設置及び干渉物の撤去等が、建屋外では燃料取出し用構台の設置工事が進められている。

今回は、2号機原子炉建屋南側ヤードで行われている燃料取出し用構台設置工事の進捗状況を確認した。（図1）（前回確認日：[令和4年2月21日](#)）

- ・前回確認時に行われていた地盤改良工事は完了し、地盤改良工事の施工路盤として使用された埋戻し土の掘削工事もほぼ終了していた。（写真1）
- ・埋戻し土の掘削が終了し捨てコンを打設した区画では、燃料取出し用構台の基礎設置に向けて、アンカーフレームの設置作業やラス（金属網）架台の設置作業等が行われていた。（写真2）

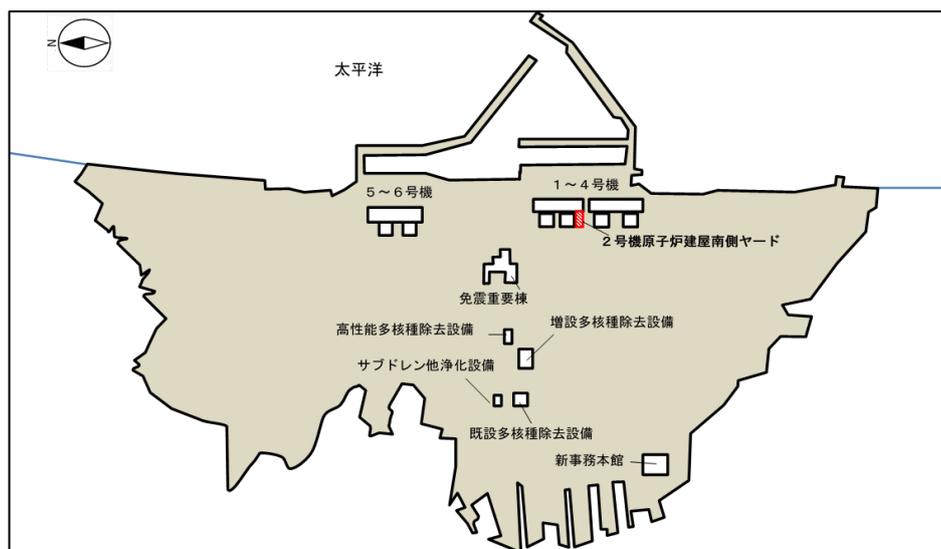


（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)
2号機原子炉建屋南側ヤードの概観
(前回(2月21日)南西側から撮影)



(写真1-2)
2号機原子炉建屋南側ヤードの概観
(今回(6月9日)南西側から撮影)

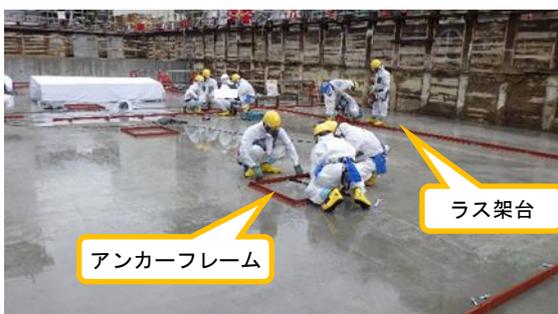

(写真2)
2号機原子炉建屋南側ヤードでの作業の状況
(北西側から撮影)

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。
