

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
令和6年9月12日（木）
- 2 確認箇所
固体廃棄物貯蔵庫第10棟（図1）
- 3 確認項目
固体廃棄物貯蔵庫第10-C棟の状況


4 確認結果の概要

廃炉作業から発生する瓦礫等の屋外一時保管を解消するため、固体廃棄物貯蔵庫第10棟（10-A棟、10-B及び10-C棟）の建設工事が進められている。

このうち、第10-A棟は令和6年8月23日から運用開始、第10-B棟は工事が概ね終了し、今月中に使用前検査を受験する予定となっている。今回は、現在建屋工事が行われている第10-C棟の状況について確認した。（前回確認：[令和6年8月1日](#)）

《現地確認結果》


- ・第10-C棟の建屋工事については、全体の約60%が組み上がっており、概ね計画どおり（令和7年3月竣工予定）進められていた。（写真1）
- ・第10-C棟南側で吸気設備建屋の設置工事が行われていた。（写真2）
- ・確認範囲において、建築廃材の飛散・流出等は確認されなかった。

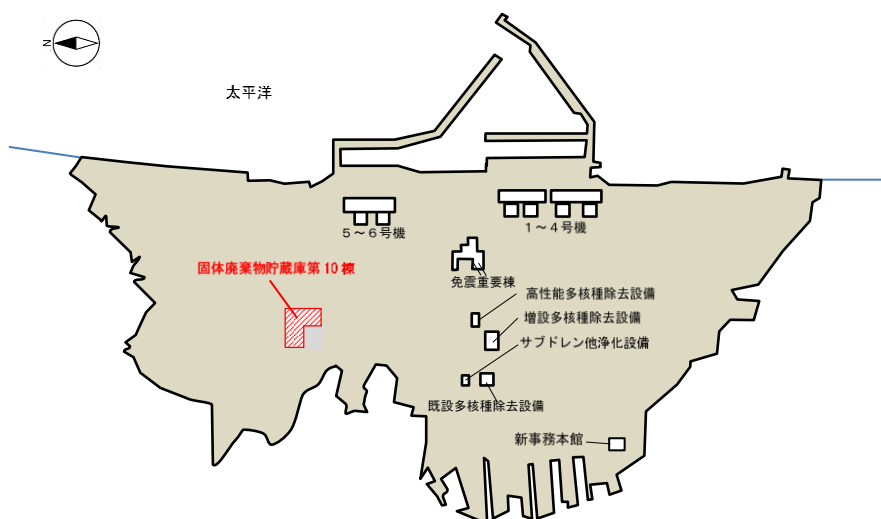

（図1） 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真 1 ①) 第 10-C 棟外観

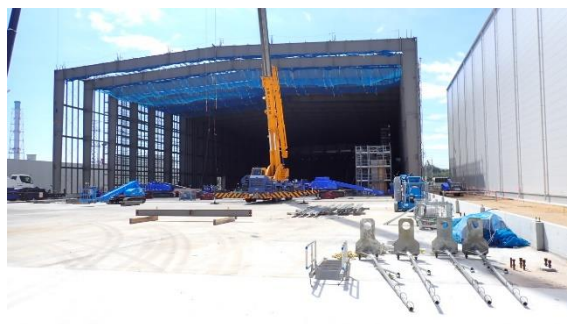

(写真 1 ②) 第 10-C 棟外観



(写真 1 ③) 第 10-C 棟内部



(写真 2) 吸気設備建屋

5 プラント関連パラメータ等確認

本日確認したデータについて、異常値は確認されなかった。
