


## 平田村の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成26年1月完了)

面的除染終了

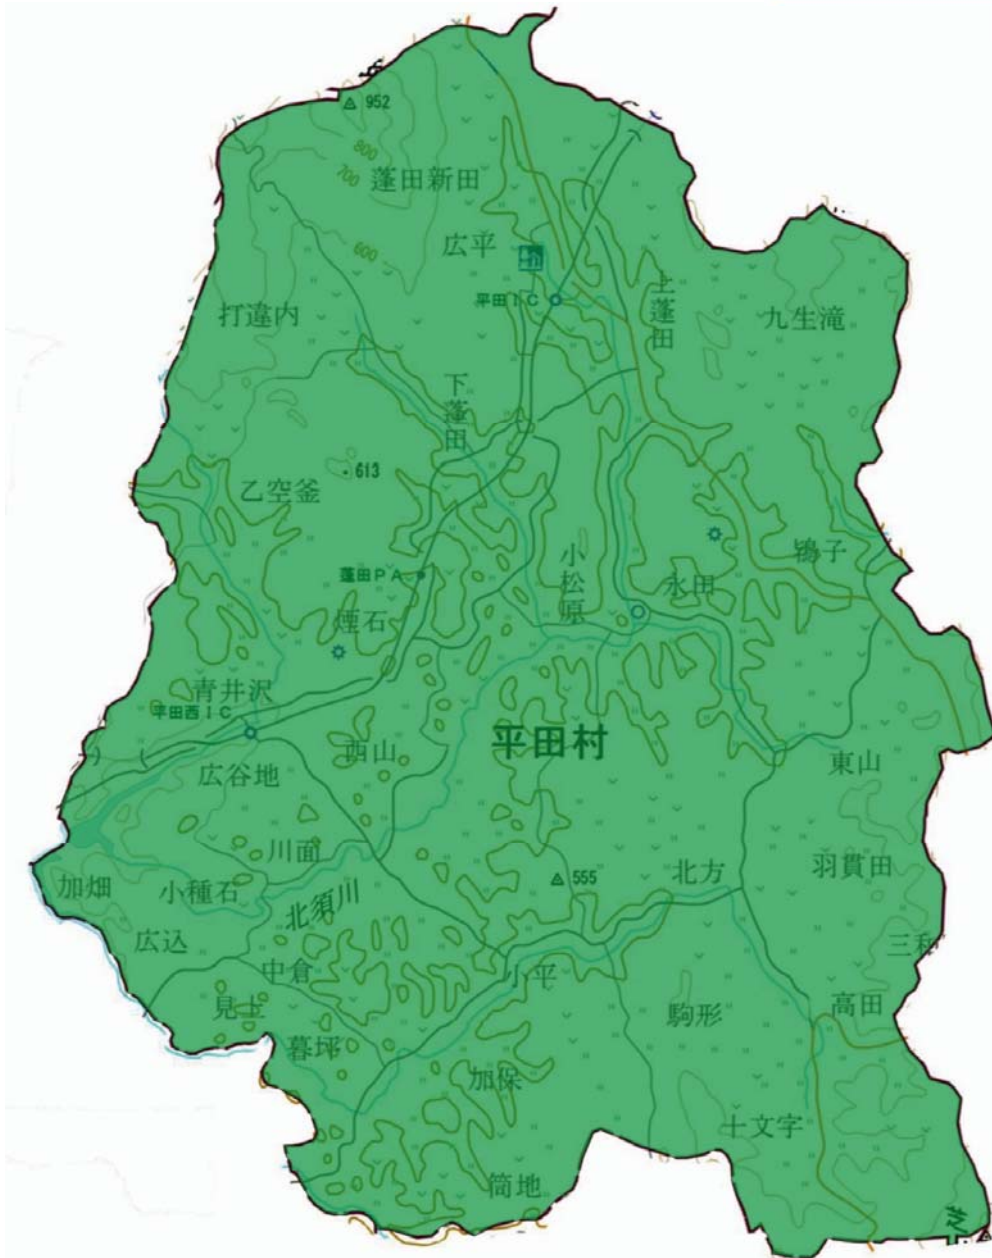

注記：空間線量率測定の結果、公共施設等の除染を実施。

## 計画数に対する除染の進捗状況(平成26年1月完了)

住宅(戸)	
進捗数	5 (100%)
発注数	5 (100%)
計画数	5

公共施設等(施設数)	
進捗数	5 (100%)
発注数	5 (100%)
計画数	5

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)	
進捗数	152.4(100%)
発注数	152.4(100%)
計画数	152.4



校庭除染工事表土剥取



校庭除染工事表土剥取



---

---

## 仮置場の整備状況(平成28年12月末時点)

---

---

仮置場            0ヶ所

※ 仮置場に保管されていた除去土壌等はパイロット輸送により全て中間貯蔵施設へ搬出され、仮置場は廃止されました。
