


福島駅前通り工事進捗状況

事業概要

路線名 福島停車場線(福島駅前通り) 福島県福島市栄町地内
 延長 L=230m
 幅員 W=約6.0(20.0)m
 内容 現況道路幅員の中で歩道、車道等を再配置します。車道は2車線を確保し型押しアスファルト舗装、歩道は拡幅し、インターロッキングブロック舗装とします。
 工期 平成28年11月～平成30年3月(予定)

施工箇所図

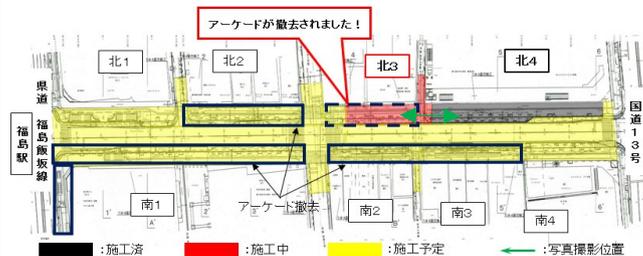

現場状況写真

北4ブロック工事着手前(平成28年9月21日撮影)



平成29年1月末現在



北4ブロックの歩道工事が一部区間を除き、完了しました。

北3ブロック工事着手前(平成28年9月21日撮影)



平成29年1月末現在



北3ブロックのアーケードが撤去され、歩道工事に着手しました。

2月の施工予定

先月に引き続き、北3ブロックにおいて歩道工事及び市道の取付工事を行います。
