


福島駅前通り工事進捗状況

事業概要

路線名 福島停車場線(福島駅前通り) 福島県福島市栄町地内
 延長 L=230m
 幅員 W=車線部6.0m(全幅20.0m)
 内容 現況道路幅員の中で歩道、車道等を再配置します。車道は2車線を確保し型押しアスファルト舗装、歩道は拡幅し、インターロッキングブロック舗装とします。
 工期 平成28年11月～平成30年3月(予定)

施工箇所図



現場状況写真

①平成29年2月1日現在



平成29年5月末現在




南2、3ブロックの車道側溝の設置が完了しました。

②南2ブロック工事着手前(平成29年2月28日撮影)



平成29年5月末現在

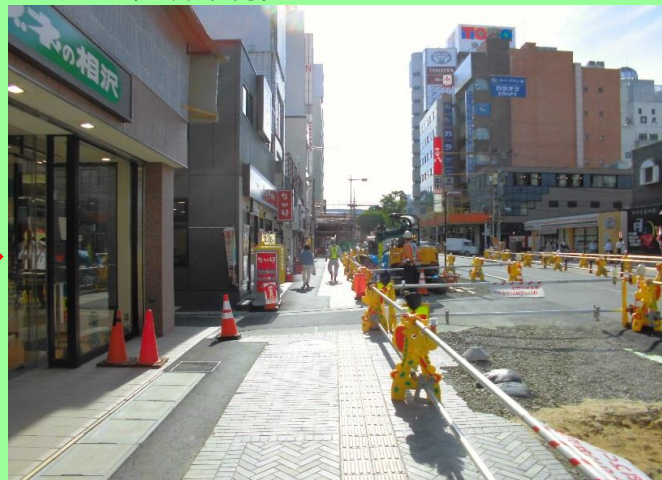

南2、3ブロックの歩道側溝の設置を行っています。

6月の施工予定

南2ブロック、南3ブロックの歩道側溝の設置、歩道ブロックの設置を行います。
