

～ 浜通り地方で1番長いトンネル工事の進捗具合をお知らせします ～

■ 工事の進捗率

平成30年4月末現在

トンネル掘削率



17%
(496m)


※トンネル掘削率とは、トンネル延長2,875mのうち、トンネル断面(右図の赤点線)の掘削が完了した延長の割合です。

トンネル完成率



6%
(172m)


※トンネル完成率とは、トンネル延長2,875mのうち、外周のコンクリート(右図の水色)と盛土(右図の茶色)が完成した延長の割合です。

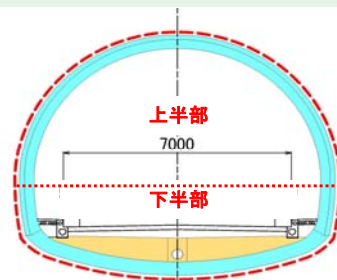

※「上半部」と「下半部」に分けて掘削しています。

■ 平面図

■ 4月の工事状況

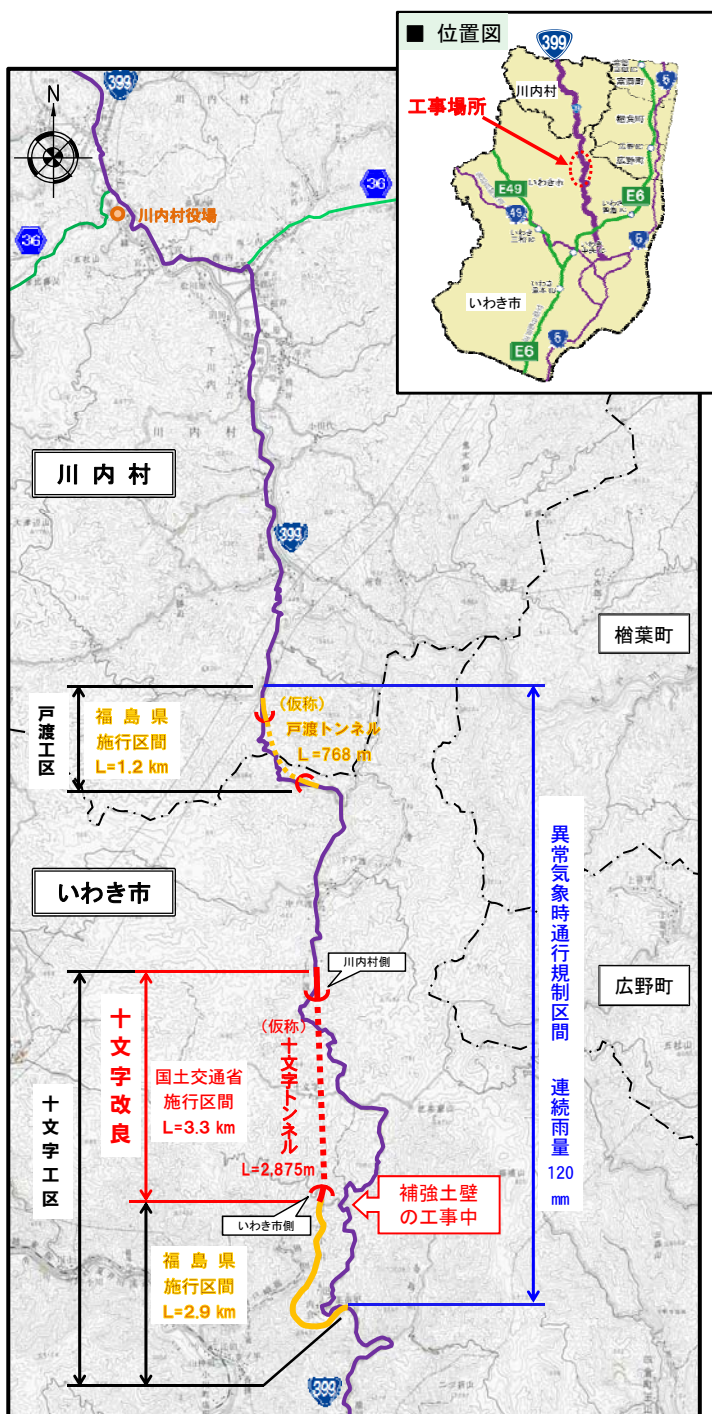

ほきょうどへき いわき市側では補強土壁の工事中!



いわき市側の工事状況

※「補強土壁」とは、鋼製の補強材とコンクリート製の壁面材とを連結して組み立てた土留め壁です。



補強材の設置状況

※盛土は20cm程度ごとに敷均し・締固めを行い、十分に締固めた後に鋼製の補強材(長さ5.0～6.5m)を設置します。



壁面材の設置状況

※クレーンにて、コンクリート製の大型壁面材(高さ約1.2m、幅約2.7m)を設置しています。



補強土壁の完成状況

※補強土壁は、2箇所です工しており、そのうち1箇所(高さ約8m)が完成しました。
