

【いわき市と川内村を結ぶバイパス工事の進み具合をお知らせします。】

工事の進捗率 (平成30年10月末現在)

34.4 %

十文字工区バイパス計画延長6.2kmのうち、県施工延長L=2.9kmの工事進捗割合を表しております。




施工状況

現在、道路改良工事と橋梁2橋を施工中です。

今回は、1工区道路改良工事の「土工」、2工区道路改良工事の「擁壁工」及び(仮)内倉2号橋上部工の施工状況をお知らせします。

計画断面




1工区 道路改良

1 道路を盛り土する前に地下排水のための管を入れているところです。



2工区 道路改良

3 8号補強土壁施工状況。写真の細長い鉄製の帯(ストリップ)を盛り土の間に挟みしっかり転圧することで強い盛り土を造ります。25~30cmごとに土を敷いてしっかり締め固め(転圧)します。

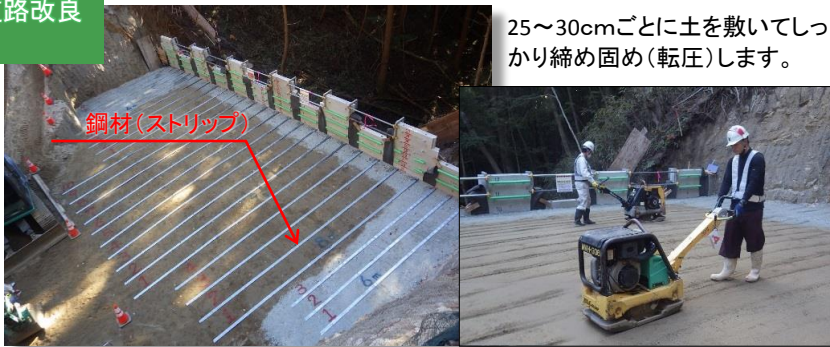

2 6号補強土壁が完成し、上部にさらに盛り土を行っています。

(仮称) 内倉2号橋



4 作業員が1本1本丁寧に鉄筋を並べて(配筋)います。
