

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

令和3年1月27日（水）

### 2 確認箇所

サブドレン集水設備No. 4 中継タンク


### 3 確認項目

サブドレン集水設備No. 4 中継タンクの復旧作業の状況

### 4 確認結果の概要

昨年12月7日にタンク内に油分の混入が確認されたサブドレン集水設備No. 4 中継タンク（図1）について、復旧に向けた作業が進められていたことから、作業の進捗状況等を確認した。（前回確認：[令和3年1月20日](#)）

- ・前回確認時に行われていたNo. 4 中継タンク内残水の仮設タンクへの移送作業については終了しており、現地確認時には移送配管等の撤去作業が行われていた。（写真1）
- ・移送配管の撤去作業に当たっては、配管末端部にビニール養生が施されており、配管内に残った水の漏えい防止対策が行われていた。（写真2）
- ・No. 4 中継タンク内の残水移送作業終了後に予定されていた同タンク内の清掃作業（汚泥除去、高圧洗浄、油分拭き取り等）についても終了しており、同タンクは復旧されていた。

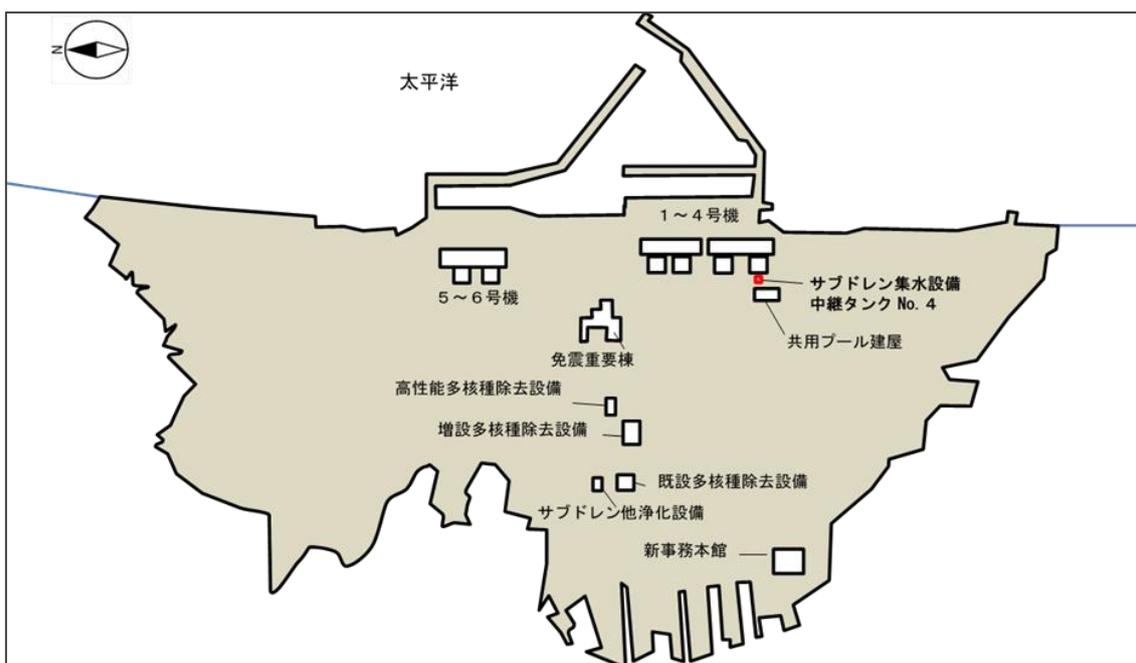

（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真 1 - 1)  
No. 4中継タンク周辺の状況  
(東側から撮影)



(写真 1 - 2)  
No. 4 中継タンクハウス内での  
移送配管撤去作業の状況  
(南側から撮影)



(写真 2)  
撤去予定の移送配管末端部の  
ビニール養生の状況

- 5 プラント関連パラメータ等確認  
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。
