


【いわき市と川内村を結ぶバイパス工事の進捗具合をお知らせします。】

工事の進捗率(令和4年3月末現在)

# 94.5 %

十文字工区バイパス計画延長6.2kmのうち、県施工延長L=2.9kmの工事進捗割合を表しております。

## 計画図

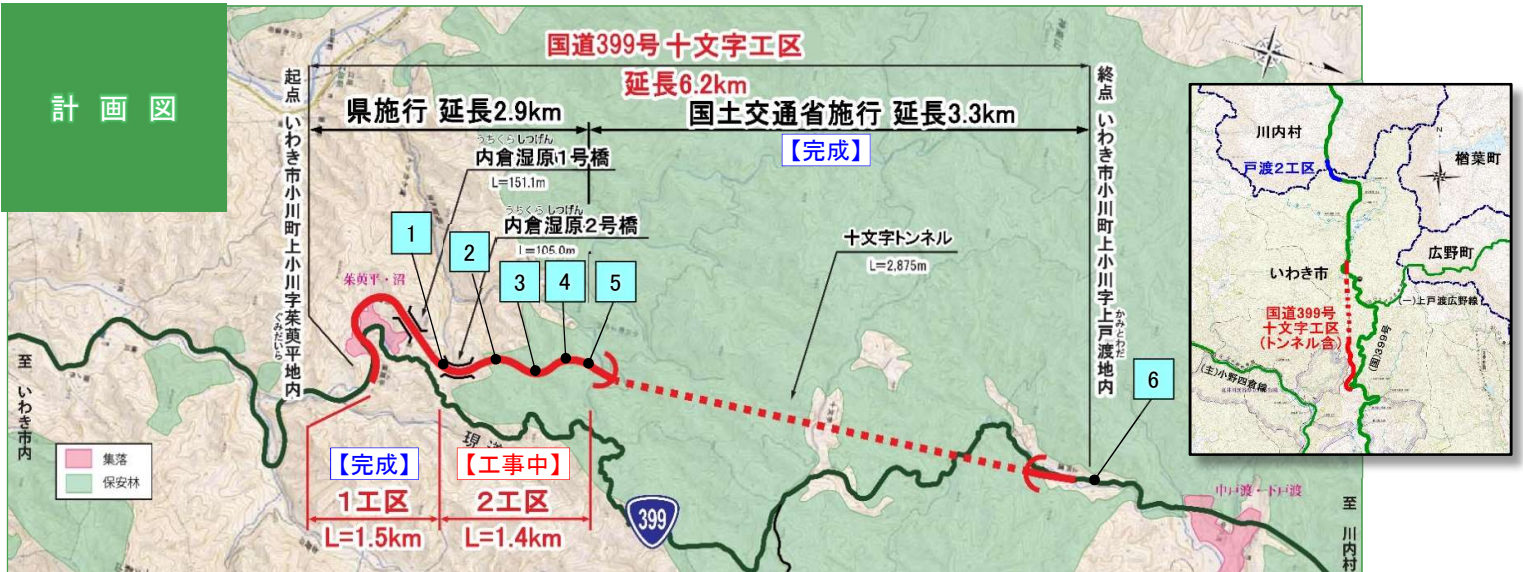

## 施工状況

現在、県施工区間2工区の道路改良工事、法面工事を施工中です。

令和3年3月に県施工区間1工区が完成。令和3年9月にはトンネルを含む直轄権限代行区間が完成しました。現在、県施工区間2工区の法面保護工や排水施設を施工中です。

## 2工区 道路改良

県施工2工区の道路改良工事では、切土箇所全9ヶ所が完了し残るC6切土部の法面保護工を施工しています。また、順次、側溝や安全施設を施工していきます。

## 2工区 法面工

切土した法面は、雨水等により浸食を受けることから植生による保護工を施工しています。法面作業は転落等の危険が伴うため、安全帯をしっかりと装着し作業を行っています。

