

## 小野町の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成27年3月末時点)

除染終了



## 平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年5月末時点)

### 住宅(戸)

進捗数	3,332
発注数	3,332
計画数	3,332

(参考)全体計画数=3,332 戸

### 公共施設等(施設数)

進捗数	162
発注数	162
計画数	162

(参考)全体計画数=162 施設

### 道路(km)

進捗数	307
発注数	307
計画数	307

(参考)全体計画数=307 km

### 森林(生活圏)(ha)

進捗数	0.2
発注数	0.2
計画数	0.2

(参考)全体計画数=0.2 ha



夏井地区除染作業



夏井地区除染作業

---

---

## 仮置場の整備状況(平成27年3月末時点)


---

---

搬入済み 0ヶ所  
搬入中 2ヶ所  
搬入前 1ヶ所



夏井地区仮置場(可燃物)

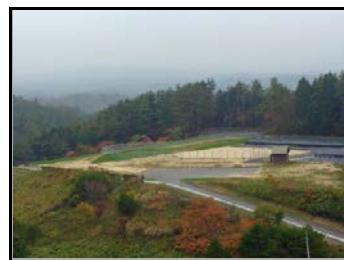

夏井地区仮置場(全景)

---

---

## 小野町の除染情報(小野町のホームページにリンク)

---

---

- ・ 小野町除染実施計画  
<http://www.town.ono.fukushima.jp/soshiki/5/josen-plan.html>
- ・ 防災  
<http://www.town.ono.fukushima.jp/life/1/7/46/>



小野町役場
