


労働環境改善スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	7月		8月				9月				10月	11月	備考		
				24	31	7	14	21	28	4	11	18	下	上	中		下	前
労働環境改善	防護装備	1 防護装備の適正化検討	(実績) ・管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※ ・管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化の運用開始(2016年3月8日～)	検討・設計	管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討(1~4号機周辺のG zone拡大に向けた検討)													
			(予定) ・管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※(運用範囲の拡大等) ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、休憩所や装備交換所で、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による安全性と作業性の向上を図る。	現場作業	管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化													
	2 重傷災害撲滅、全災害発生数の推移	(実績) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全推進協議会の開催(毎週):災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) ・熱中症予防対策の実施(5~9月)	現場作業	情報共有、安全施策の検討・評価														
		(予定) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全推進協議会の開催(毎週):災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) ・熱中症予防対策の実施(5~9月)	現場作業	熱中症予防対策の実施(5~9月)														
健康管理	3 長期健康管理の実施	(実績) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2016年度対象者(協力企業作業員)への検査案内準備及び送付	現場作業	健康相談受付														
		(予定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2016年度対象者(社員)への「白内障検査」(福島)実施	現場作業	【検査受診期間】 検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用清算手続き、2016年度対象者(協力企業作業員)への検査案内準備及び案内送付														
	4 継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	(実績) ・1F救急医療室の2016年9月までの医師確保完了(固定医師1名+0-7-30支援医師)	検討・設計	各医療拠点の体制検討														
		(予定) ・1F救急医療室の10~1月中旬の勤務医師調整	現場作業	1F救急医療室の10~1月中旬の勤務医師調整														

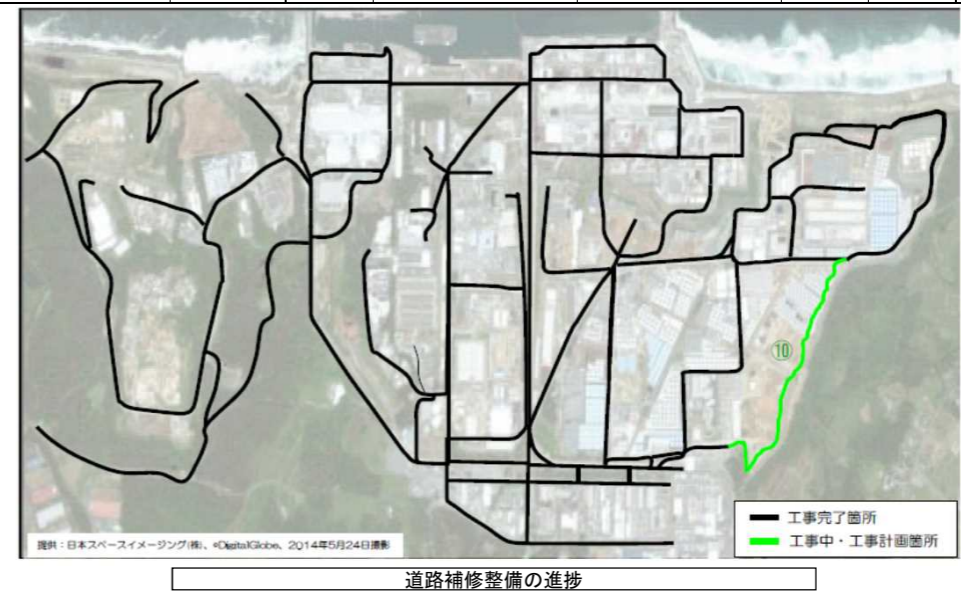

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		7月		8月				9月			10月			11月			備考
			24	31	7	14	21	28	4	11	18	下	上	中	下	前	後			
要員管理、労働環境改善	5	<p>作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握</p> <p>(実績) ・作業員の確保状況(7月実績/9月の予定)と地元雇用率(7月実績)についての調査・集計</p> <p>(予定) ・作業員の確保状況(8月実績/10月の予定)と地元雇用率(8月実績)についての調査・集計</p>	検討・設計	▼作業員の確保状況調査依頼				▼作業員の確保状況集約				▼作業員の確保状況集約			▼作業員の確保状況集約					
				作業員の確保状況(7月実績/9月予定)と地元雇用率(7月実績)についての調査・集計				作業員の確保状況(8月実績/10月予定)と地元雇用率(8月実績)についての調査・集計				作業員の確保状況(9月実績/11月予定)と地元雇用率(9月実績)についての調査・集計			作業員の確保状況(9月実績/11月予定)と地元雇用率(9月実績)についての調査・集計					
	6	<p>労働環境・生活環境・就労実態に関する企業との取り組み</p> <p>(実績) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応</p> <p>(予定) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握(継続的に実施) ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック(継続的に実施) ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応(継続的に実施) ・作業員へのアンケートによる実態把握</p>	検討・設計	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施																
				現場作業	▼協力企業との意見交換会(7/29)	配布(8/25~)	作業員へのアンケート(第7回)	回収(9月中下旬)	公表(11月下旬)	協業企業との意見交換会(9/30)										
7	<p>新事務本館の建設</p> <p>(実績) ・内装工事 ・設備工事 ・外構工事</p> <p>(予定) ・内装工事 ・設備工事 ・外構工事</p>	現場作業	内装工事												▽運用開始(10月上旬)	2016年10月上旬運用開始				
			設備工事																	
8	<p>道路整備の実施</p> <p>(予定) ・⑩Jエリア周辺道路工事の検討・設計 ・⑩Jエリア周辺道路工事</p> <p>(実績) ・⑩Jエリア周辺道路工事の検討・設計 ・⑩Jエリア周辺道路工事</p>	検討・設計	⑩Jエリア周辺道路工事の検討・設計																	
			現場作業	⑩Jエリア周辺道路工事																
