


河川の被害箇所と今後の見通し(決壊・越水箇所)

令和2年2月17日

凡例	
●	決壊箇所
●	越水箇所

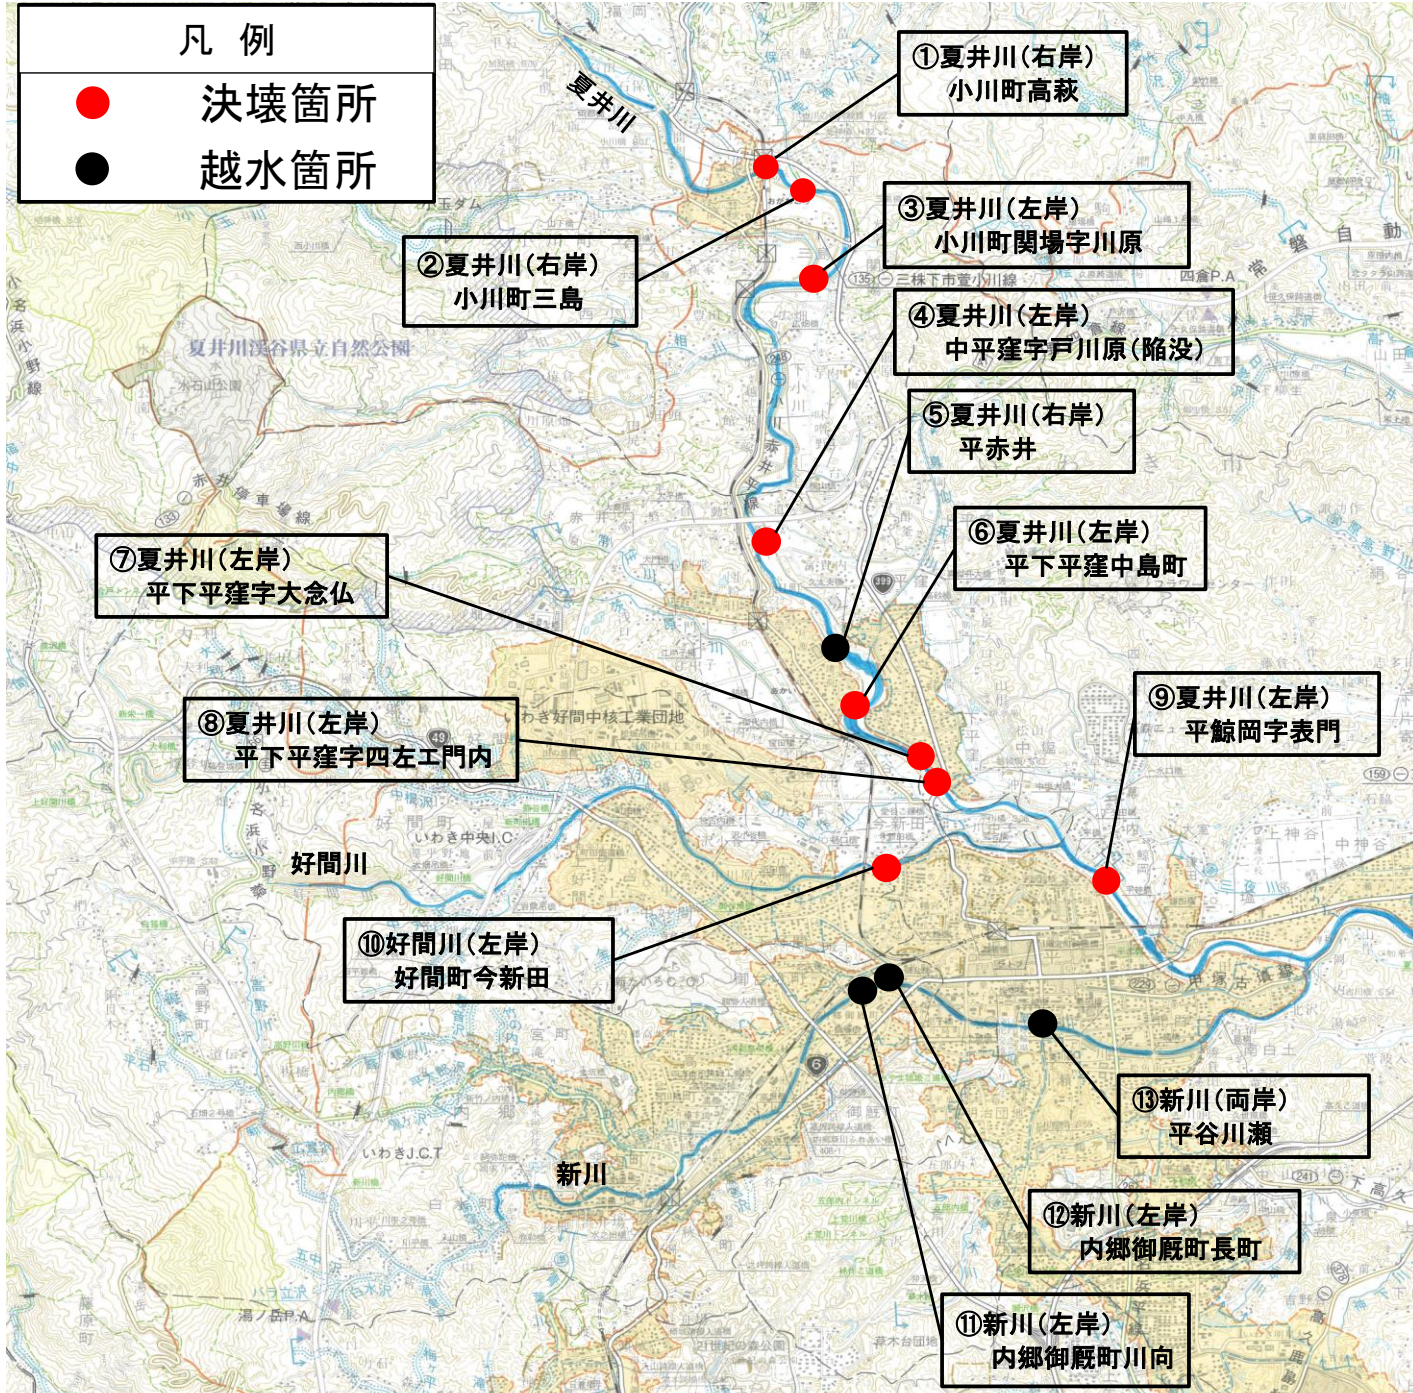

種別	No.	河川名	箇所	災害種別	対応状況	応急復旧完了日	本復旧工事2月契約予定	
二級河川	1	夏井川	小川町高萩	決壊	・堤長L=90m ・大型土のう 180俵 ・施工中 大型土のう(金2俵)設置完了 盛土29日完了	10月29日	○	
	2		小川町三島	決壊	・堤長L=25m ・大型土のう 140俵 ・施工中 大型土のう(金3俵)設置完了 盛土29日完了	10月29日	○	
	3		小川町関場字川原	決壊	・堤長L=70m ・大型土のう 1500俵 ・施工中 大型土のう設置28日完了 盛土28日完了	10月28日	○	
	4		中平窪戸川原	決壊	・堤長L=29m ・大型土のう 580俵 ・施工中 大型土のう設置11月13日完了 (現在原因調査中)	11月13日	発注準備中	
	5		平赤井	越水	-	-	-	-
	6		平下平窪中島町	決壊	・堤長L=30m ・大型土のう 400俵 ・施工中 大型土のう設置18日完了 盛土21日完了	10月21日	○	
	7		平下平窪字大念仏	決壊	・堤長L=30m ・大型土のう 400俵 ・施工中 大型土のう設置17日完了 盛土21日完了	10月21日	○	
	8		平下平窪字四左工門内	決壊	・堤長L=25m ・大型土のう 115俵 ・施工中 大型土のう15日完了 盛土16日完了	10月16日	○	
	9		平鯨岡字表門	決壊	・堤長L=25m、高さ4m程度 ・大型土のう 110俵 ・施工完了 大型土のう設置17日完了 盛土18日施工完了	10月18日	○	
	10	好間川	好間町今新田	決壊	・堤長L=25m ・大型土のう 300俵 ・施工中 大型土のう設置18日完了 盛土24日完成	10月24日	○	
	11	新川	内郷御殿町川向	越水	-	-	-	-
	12		内郷御殿町長町	越水	・堤長L=30m ・大型土のう 50俵 ・施工中 大型土のう設置18日完了 盛土21日完了	10月21日	発注準備中	
	13		平谷川瀬	越水	-	-	-	-

※1 本表は、夏井川、好間川、新川の令和元年10月12日から13日の台風19号の影響で決壊や越水した代表箇所を掲載しています。
 ※2 表中、発注準備中の箇所については、準備が整った箇所から工事の発注を行っていきます。

