# 国道121号下郷田島バイパス 進捗状況



一般道路 約1km

▶車道幅 7.0m(片側一車線)

令和6年度は、下郷町で(仮)1号橋、(仮)5号橋の下部工事、南会津町で改良工事を実施しました。 令和7年度は、下郷町で(仮)1号橋の下部工工事、南会津町で改良工事を実施中です。

## 国道352号見通工区 進捗状況

#### 令和7年6月末現在 事業進捗率80%

#### 事業の目的

道幅が狭く、また橋の前後が急 カーブとなっており、事故の危険 性が高いことから、円滑で安全な 交通を確保するため、新しい道路 を整備しています。

#### 事業の概要

- ◆計画延長 780m 内、見通橋70m
- ◆道路幅 9.25m (片側一車線、片側歩道)

令和6年11月22日、見通橋が開通しました。 令和7年度は、橋梁下部の護岸工事を実施します。

#### 工事着手前 (平成 2 4 年度)



#### 見通橋開通式状況



#### 見通橋開通式状況



檜枝岐村字見通地内

## 国道252号(仮)あいよし橋 進捗状況

# (気) ホール (大) エッド (大)

#### 事業の目的

令和4年3月の雪崩により、あいよし橋と出 逢橋が被災しました。今後同様の雪崩が発生 した場合でも通行を確保できるよう、災害復旧 事業として、現在の位置よりも谷側に新しい橋 を整備します。

#### 事業の概要

- ◆計画延長 480m 内、(仮)あいよし橋 289m
- ◆車道幅 6.0(8.0)m(片側一車線)

令和7年6月末現在 事業進捗率22.4%



令和7年4月には出逢橋の流失が確認されましたが仮道工事を実施し、8月8日に再開通いたしました。

# 国道289号入叶津道路 進捗状況


只見町大字叶津地内

#### 事業の目的

通行不能区間の解消を図り、 福島県と新潟県の交流を強 化するため、新しい道路を整 備しています。

#### 事業の概要

- ◆計画延長 約7.8km
- ◆事業実施年度 S48~
- ◆構造物は、トンネル3基、橋梁9 橋、スノーシェッド3基

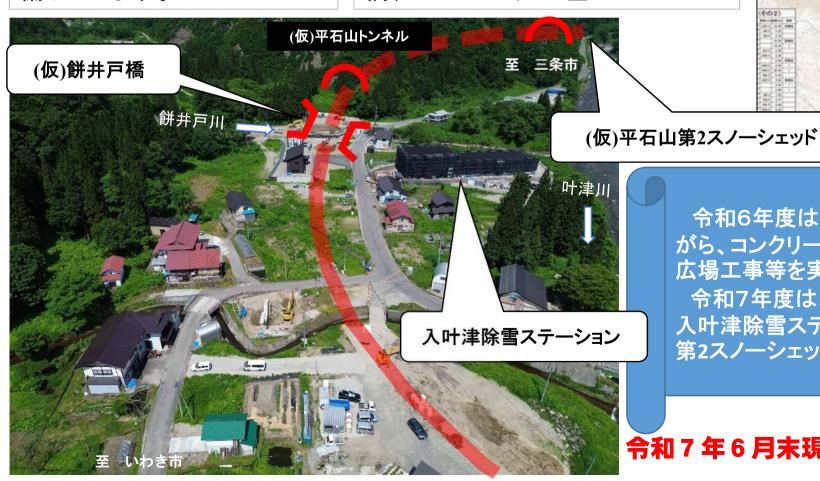

ス叶津道路 国道252号

位置図

令和6年度は、自然環境に配慮しながら、コンクリート舗装工事及び回転 広場工事等を実施しました。

令和7年度は、暫定開通に向けて、 入叶津除雪ステーション及び平石山 第2スノーシェッド等の整備を進めます。

令和7年6月末現在 事業進捗率87%

# 只見川 河川改修 進捗状況

#### 令和7年6月末現在事業進捗率29%

#### 事業の目的

人家への浸水被害の軽減を 図るため、河道掘削や堤防の 嵩上げ、護岸工等の整備を進 めています。

#### 事業の概要

- ◆河川改修事業 全体延長5, 300m
- ◆平成27年度着工

令和6年度は、築堤護岸や樋門工事を実施しました。 令和7年度は、河道掘削を実施していきます。









## 西根川 土砂災害対策 進捗状況

#### 令和7年6月末現在 事業進捗率 2%

#### 事業の目的

田代山の山腹崩壊等に伴う 下流域への土砂流出を抑制 し、浸水リスクを軽減するため、砂防えん堤の整備を進め ています。

#### 事業の概要

- ◆砂防えん堤工 4基
- ◆管理用道路工
- ◆河道掘削工
- ◆令和4年度着工

令和7年度は砂防えん堤工事に着手するための工事用道路 や河道掘削工を実施します。

#### 被害状況(木賊地区)




#### 被害状況(川衣地区)



#### 位置図



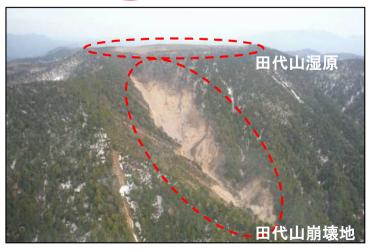

# 高陦田島線歩道補修 進捗状況

#### 工事着手前



#### 令和7年6月末現在 工事進捗率33% R7工事完了後



令和7年度は、全体計画1,104mのうち約50m区間の歩道工事を完了しました。令和8年度は、引き続き残りの区間を進めていきます。

#### 事業の目的

歩道表面が劣化し段差が生じて おり、通行に支障を来たしているこ とから、歩道表面の補修を行って いきます。

#### 事業の概要

- ◆計画延長 1,104m
- ◆歩道幅 1.5m



### 国道352号中山峙町村合併支援道路 進捗状況

#### 事業の目的

急峻な地形のため、幅員が狭く、 急勾配・急カーブが多いことから、 円滑で安全な交通を確保し、町村 合併した二つの地域の結びつきを 強くするため、新しいトンネルと橋 を整備しています。

#### 事業の概要

- ◆計画延長 2,271m 新中山トンネル522m、銀竜橋 155m、 金龍橋 108m、(仮)龍神橋131.5m
- ◆無散水消雪 1,380m
- ◆車道幅 6.0m(片側一車線)



南会津町滝原地内


令和7年6月末現在 事業進捗率75%

令和6年度は、(仮)龍神橋の下部工事及び道路改良工事を実施 しました。令和7年度は、橋梁下部工2基を実施します。

事業着手前(平成19年度)





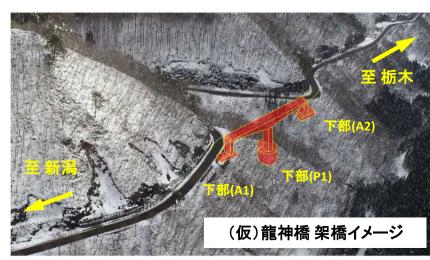

# 国道352号 福渡工区 進捗状況



#### ◆計画延長 1580m 内、穴沢橋(仮) 85.0m

◆車道幅 6.0(10.5)m~6.5(11.0)(片側一車線)

令和7年6月末現在 事業進捗率15%

## 南会津地区特別支援学校整備事業進捗状況

○ 令和7年6月末現在 進捗状況44%

令和8年4月開校に向け、南会津地区に居住する児童生徒のため の特別支援学校整備を行っています。





#### 事業の目的

通学等の負担を軽減し、障がいのある児童生徒が地域の学校で安心して学ぶことができるよう南会津地区に新たな特別支援学校を整備する。

#### 事業の概要

·校舎新築(木造) 2,224.29㎡

• 渡り廊下新築 28.8 m

•EV棟新築 34.1㎡

・既存校舎改修 781.0㎡

・外構整備(造成,駐車場ほか)

