


小名浜道路の工事状況（令和4年10月時点）

1. はじめに

ふくしま復興再生道路として事業を進めております小名浜道路は、現在全地区で工事に着手しています。工事の進捗について皆様の疑問にお答えするため、工事の流れと各地区毎の工事の状況をお知らせします。小名浜道路は土工区間と橋梁区間で構成されています。まず、それぞれの工事の流れをこれから説明します。

2. 工事の流れ

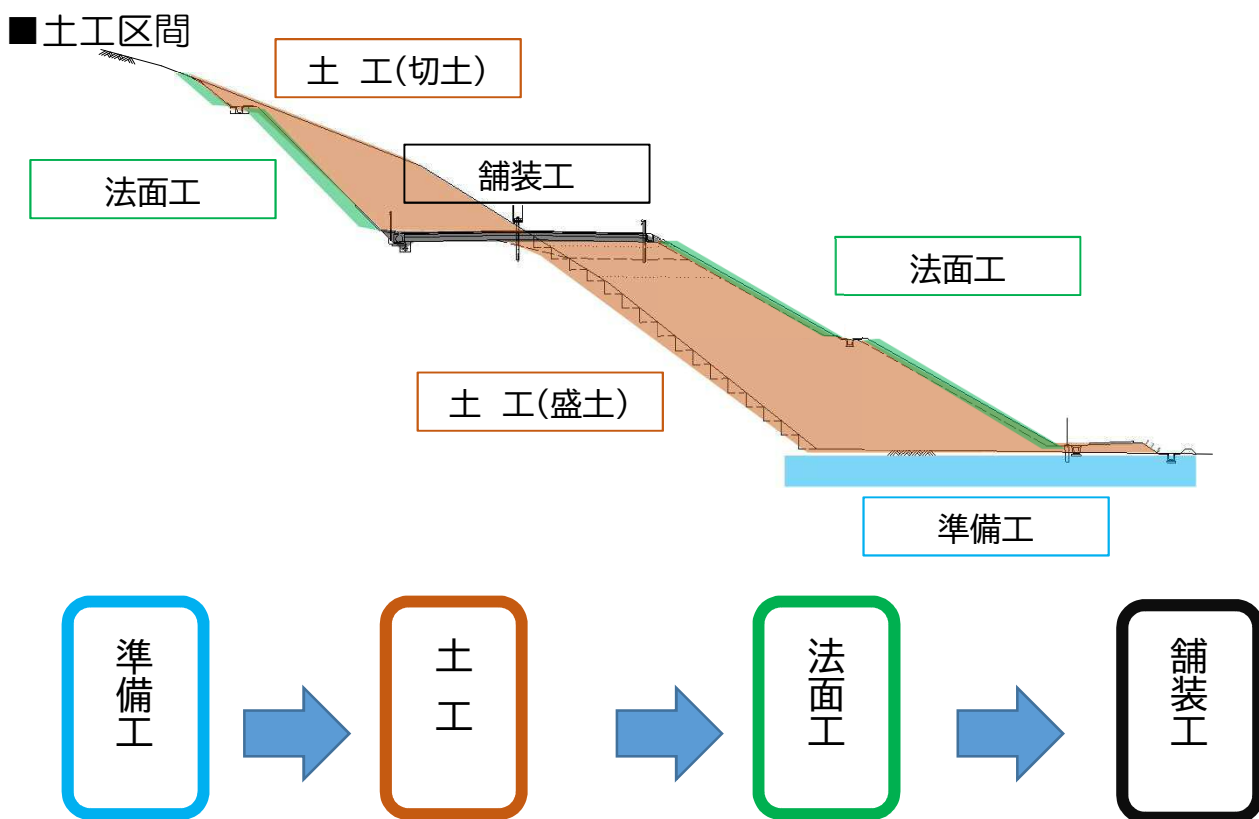


- 準備工：工事を始める前に除草や木の根の除去を行います。測量を行い工事の完成形の目印を設置します。
- 土工：土を盛ったり、山を切ったりします。雨を流す排水工を設置します。場所によっては地盤の弱い部分を強くしたり、元々あった道などを付け替えたりします。地形によっては擁壁やボックスカルバートの構造の部分もあります。
- 法面工：山を切ったり土を盛ってできる斜面が崩れないように緑化などで保護します。
※地形によっては行わない区間もあります
- 舗装工：舗装の表面はアスファルトで行います。アスファルトの下には砕石の層を数層下から順に作ります。ガードレールや区画線、標識などを設置することで安全に通行できる道路が完成します。


以上が土工区間の工事の流れとなります。橋梁区間の工事の流れに続きます。

■ 橋梁区間

断面図

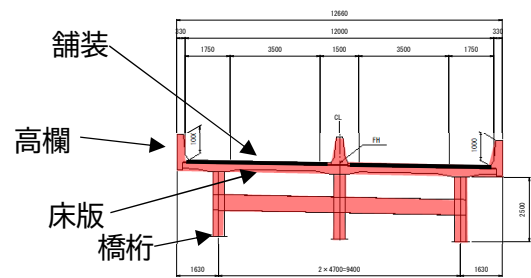

側面図

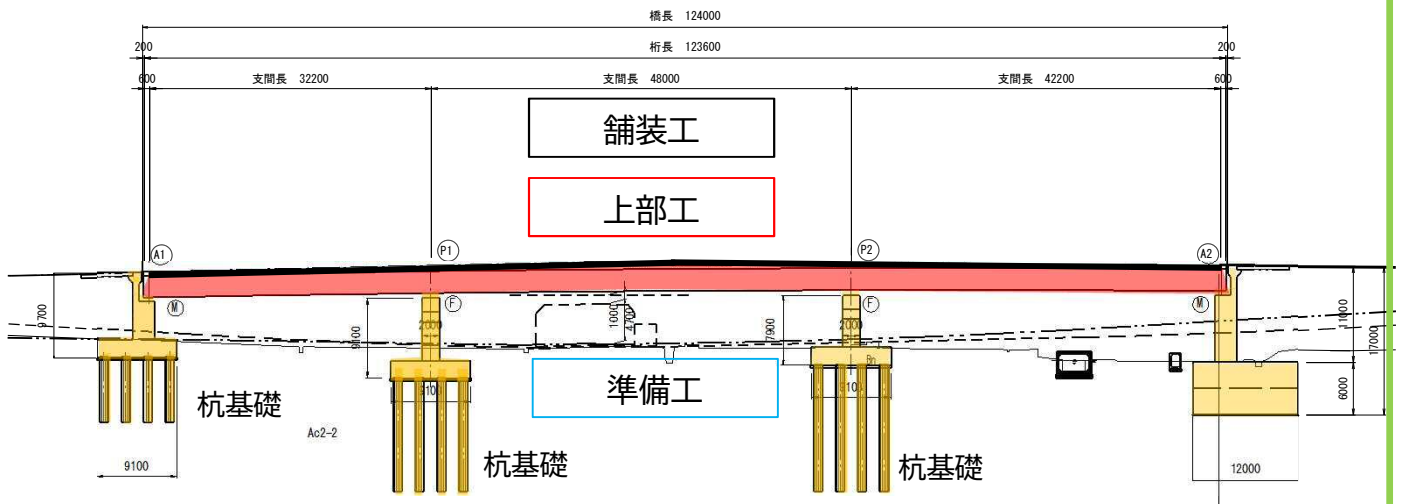


下部工(橋台)

下部工(橋脚)

下部工(橋脚)

下部工(橋台)




- 準備工：工事を始める前に除草や木の根の除去を行います。測量を行い工事の完成形の目印を設置します。
- 下部工：橋の両端を支える橋台、中間を支える橋脚を作ります。地盤が弱い部分では先に杭基礎を地中に作ります。
- 上部工：コンクリートや鋼製の橋桁を下部工の上に設置します。高欄や排水、舗装の下の床版まで作ります。
- 舗装工：上部工で出来た床版の上に舗装します。区画線、標識などを設置することで安全に通行出来る道路が完成します。

以上が橋梁区間の工事の流れとなります。次ページ以降で各地区の位置、土工区間、橋梁区間それぞれの工事がどの段階にあるのか、最新の写真とともにお示しします。


3. 各地区の進捗状況

■臨港地区

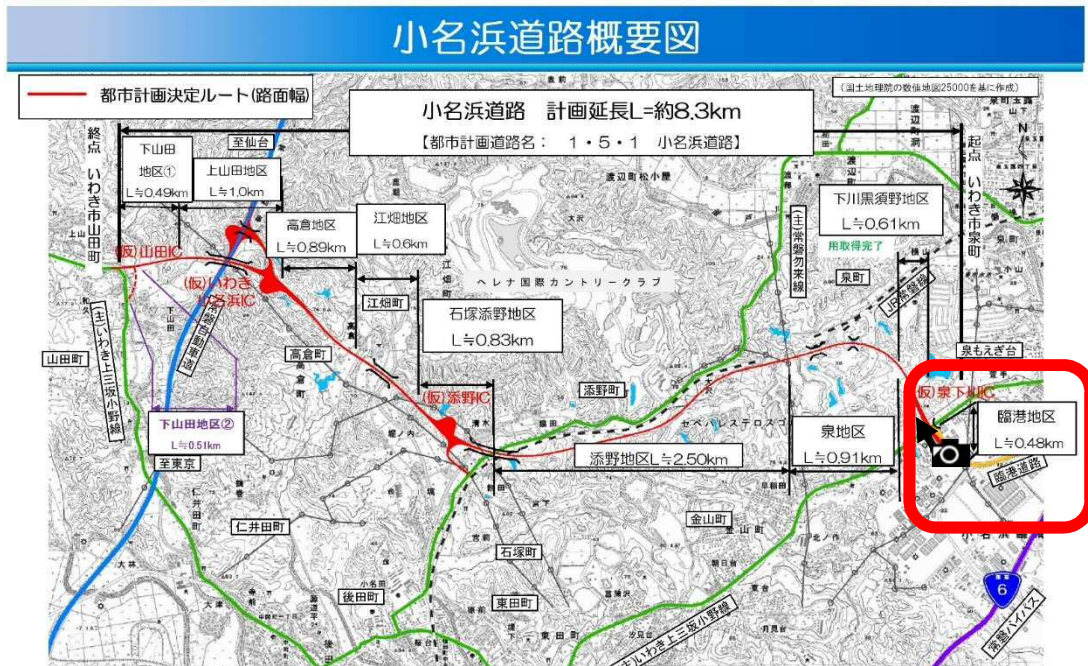


■土工区間

↓土工工事中



■橋梁区間

↓上部工完了



泉下川橋



至 小名浜港

令和4年8月撮影


3. 各地区の進捗状況

■ 下川黒須野地区



■ 土工区間

↓ 土工工事中



■ 橋梁区間

泉下川橋は臨港地区と下川黒須野地区に跨がっています。進捗は臨港地区で説明します。




至 小名浜港

令和4年8月撮影


3. 各地区の進捗状況

■ 泉地区

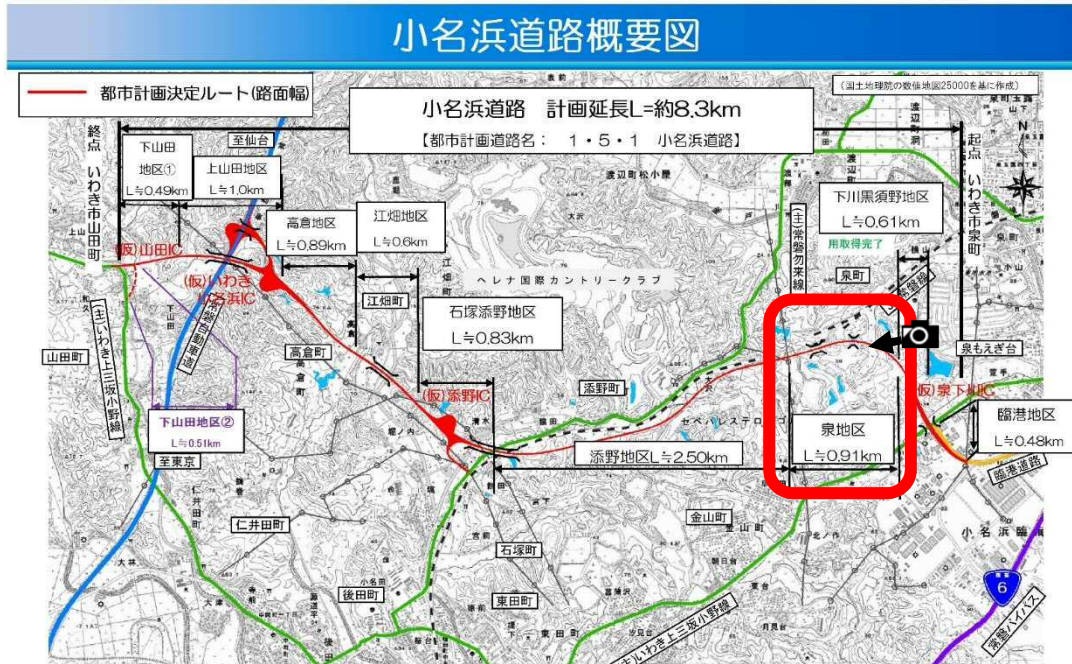


■ 土工区間

↓ 準備工工事中



■ 橋梁区間

↓ 準備工工事中




至 小名浜港

令和4年10月撮影


3. 各地区の進捗状況

■ 添野地区

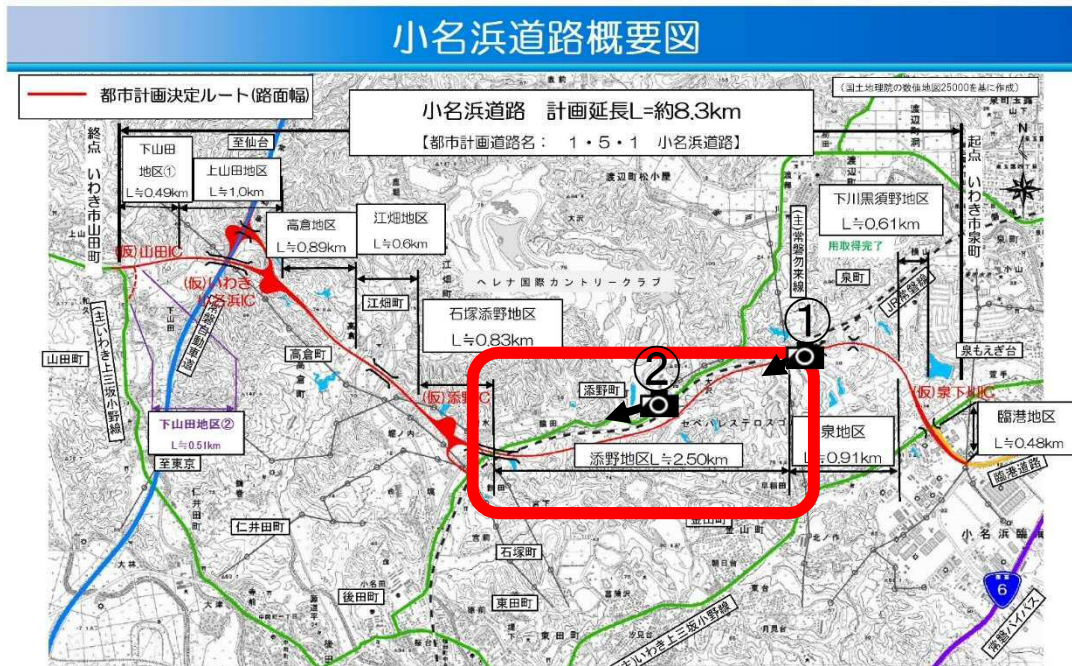


■ 土工区間

↓ 土工工事中



■ 橋梁区間

↓ 上部工完了



本線ボックスカルバート

至 小名浜港



添野大橋

至 小名浜港

令和4年10月撮影


3. 各地区の進捗状況

■石塚添野地区



■土工区間

↓県道取付工事中



■橋梁区間

添野大橋は添野地区と石塚添野地区に跨がっています。進捗は添野地区で説明します。

至 常磐自動車道




至 小名浜港

令和4年10月撮影


3. 各地区の進捗状況

■江畑地区

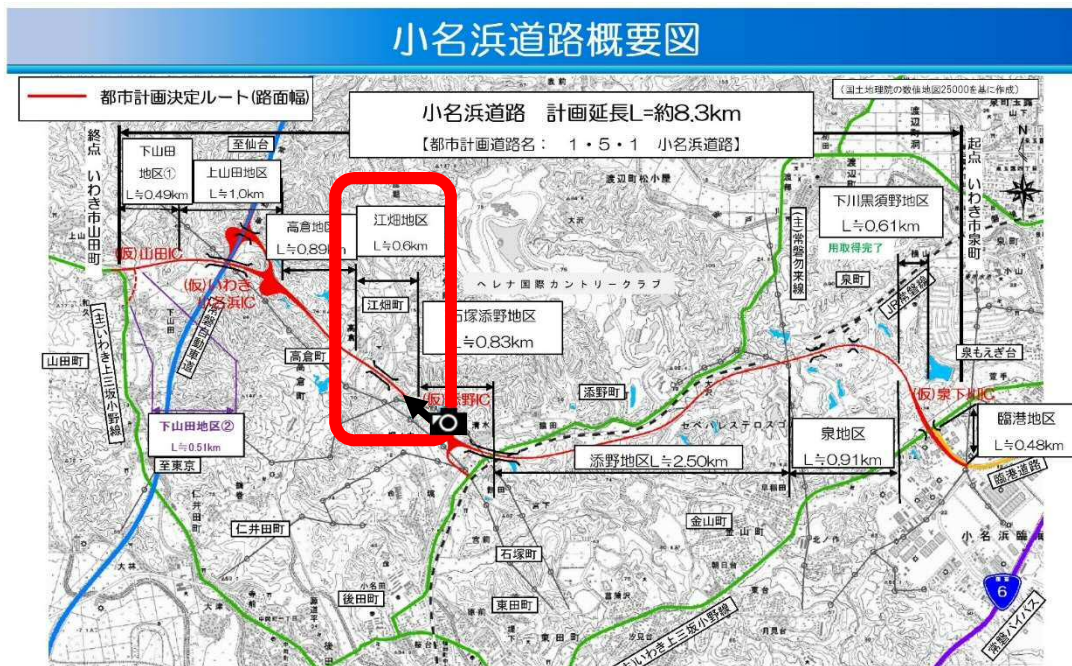


■土工区間

↓土工・法面工完了



■橋梁区間

↓上部工完了




至 小名浜港

令和4年10月撮影


3. 各地区の進捗状況

■高倉地区

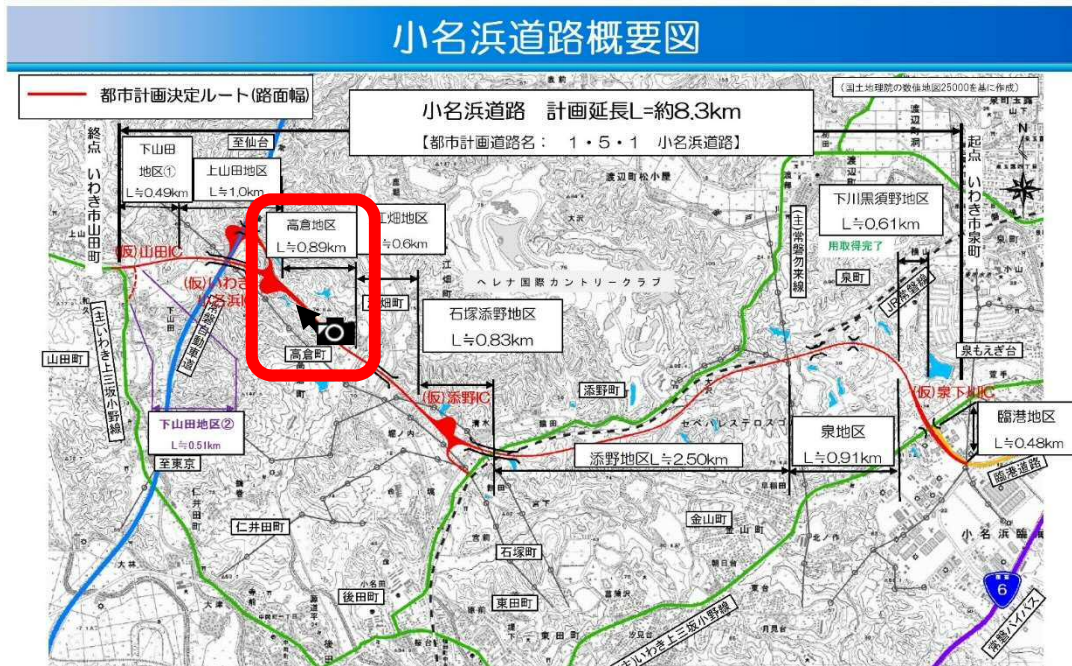

■土工区間

↓土工工事中



■橋梁区間

高倉地区には橋梁区間はありません



至 小名浜港

令和4年10月撮影


3. 各地区の進捗状況

■上山田地区




■土工区間

↓土工工事中



■橋梁区間

↓上部工工事中




至 小名浜港

令和4年10月撮影


3. 各地区の進捗状況

■下山田地区

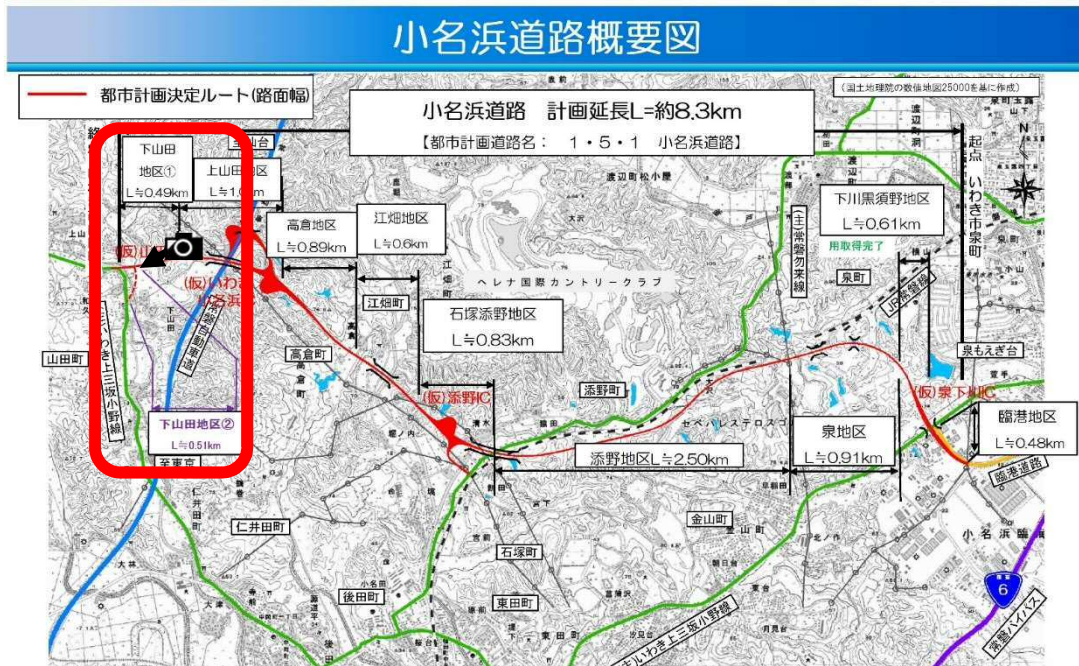


■土工区間

↓土工工事中



■橋梁区間

↓下部工工事中



至 小名浜港

令和4年10月撮影

4. おわりに

以上が臨港地区から下山田地区までの工事の進捗状況となります。地区毎の進捗状況は異なりますが、各地区ともに安全を最優先に工事を進めてまいります。資機材の搬入や土砂等の運搬など近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、注意して工事を行いますのでご理解・ご協力をいただければと思います。

今後も定期的にニュースレターを発信して小名浜道路のことを皆様に知っていただけるよう努めます。

至
いわ
き湯
本
I.C



至小名浜港

至
いわ
き勿
来
I.C

至山田

小名浜道路と常磐自動車道の交差部工事状況

福島県いわき建設事務所
〒970-8026 福島県いわき市平字梅本15番地
電話 0246-24-6036、FAX 0246-24-6155
<http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>

