

H25 土木部重点施策の成果と今後の取組

平成25年11月25日 土木部
新生ふくしま復興推進本部会議資料

避難者の居住の安定確保

【復興公営住宅:3700戸 H27整備(P)】

○H25 県営分の目標

- ・第1期 500戸 → 工事着手
- ・第2期1000戸 → 用地確保・設計
- ・第3期1700戸 → 用地確保

【11月までの実績・成果(D)】

- ・第1期500戸分のうち430戸工事着手
- ・第2期1000戸のうち793戸分用地調整
- ・設計施工一括選定で2地区(北信、笹谷)の設計委託契約締結(11/5)
- ・UR都市機構との協定締結調整(11/12)

【今後の取組み(C・A)】

- 部内連携体制強化(建築、都市縦室)
 - ・業務分担整理
 - ・アウトソーシング推進
 - ・調査、設計等の着手
- UR都市機構への建設要請
 - ・11月26日に協定締結予定
 - ・早期に用地、計画を確定
 - ・建設要請
- 木造住宅団地の整備手法の検討
 - ・今後制度構築



第一次福島県復興公営住宅整備計画

箇所	いわき市	南相馬市	郡山市	福島市	会津若松市	二本松市・桑折町・川俣町・大玉村・三島町 他	合計
戸数	1,800戸	410戸	390戸	170戸	100戸	830戸	3,700戸

公共土木施設等の復旧

【早期復旧(P)】

- 地震被害施設等:H25完成目標
- 津波被害施設:H27完成目標

【11月までの実績・成果(D)】

- ・被災箇所2,638件
 - 着工2,166件(82%)、完了1,575件(60%)
- ・夏井地区海岸(ガレキ有効利用CSG工法) 10月末完了
- ・国道252号二本木橋完了(11/2)
- ・11月臨時議会 工事契約(災害復旧等)39件

【今後の取組み(C・A)】

- 課題解決に向けた取組みの継続
 - ・入札不調対策
 - ・施行体制の確保
 - ・マンパワー不足対策(浜通り復興加速化チーム等)
- 計画的な事業執行
 - ・大規模工事の計画的発注



木崎海岸(相馬郡新地町)

避津波被災地の復興まちづくり

【防災緑地等:H27完了目標(P)】

- 防災緑地整備事業(新地町、相馬市、広野町、いわき市10地区)

【11月までの実績・成果(D)】

- ・防災緑地事業
 - 全10地区で事業着手、3地区で工事着手
- ・防災集団移転促進事業(市・町)
 - 10地区の造成工事完了、宅地の引渡開始
- ・土地区画整理事業(市・町)
 - いわき市の6地区で工事着手

【今後の取組み(C・A)】

- 防災緑地事業:
 - ・新たに6地区で工事着手
 - ・残り1地区H26に工事着手予定
- 防災集団移転促進事業:
 - ・新たに21地区の造成工事が完了
 - ・新築住宅への入居も開始予定
- 土地区画整理事業:
 - 残り1地区(新地町)工事着手

いわき市豊間地区復興イメージ



帰還・復興を支援する道路整備

【ふくしま道づくりプラン(復興計画対応版)(3/18策定)に基づく事業推進(P)】

【11月までの実績・成果(D)】

- ・国道114号小綱木BP1工区供用(4/24)
- ・国道288号三春西BP供用(5/23)
- ・国代行予定3路線 県公共事業評価委員会で県方針を了承(8/8) 調査測量設計推進と地域の合意形成
- ・県道原町川俣線水境工区供用予定(11/29予定)

【今後の取組み(C・A)】

- 「ふくしま復興再生道路8路線」整備
 - ・目標:概ね10年で概成を図る(H30年代前半)
 - ・対応:各工区の一日も早い完成を目指し、綿密な工程管理を実施
- 「国代行要請予定3路線3工区」
 - ・目標:H26年度後半国代行業採択
 - ・対応:代行採択に向け、国との調整を推進(必要性整理、手続整理、環境整備、採択時期、財源確保)



至 郡山市 国道288号 三春西BP

年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	計
完成予定工区数	2	5	1	1	3	2	1	3	11	8路線 29工区

(予算状況等により今後変動もある)

放射性物質に汚染された下水汚泥の適切な処理処分


【下水汚泥の速やかな処理処分(P)】

【11月までの実績・成果(D)】

- ◇県北浄化センター
 - ・乾燥施設建設の条件であった「乾燥汚泥の搬出先」を確保
- ◇県中浄化センター
 - ・保管汚泥は、9月から環境省事業により、焼却処理を開始

【今後の取組み(C・A)】

- ◇県北浄化センター
 - ・乾燥施設建設に向け、環境省、町、地元と調整を行う。
- ◇県中浄化センター
 - ・焼却処理施設(環境省事業、平成25年度末終了予定)の継続運転を環境省、及び関係機関と調整

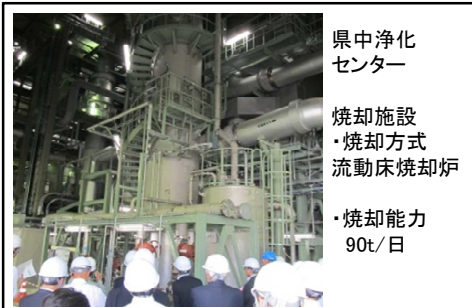

県中浄化センター

焼却施設
・焼却方式
流動床焼却炉・焼却能力
90t/日
