


## 西郷村の除染実施状況

住宅除染進捗図(平成29年3月完了)

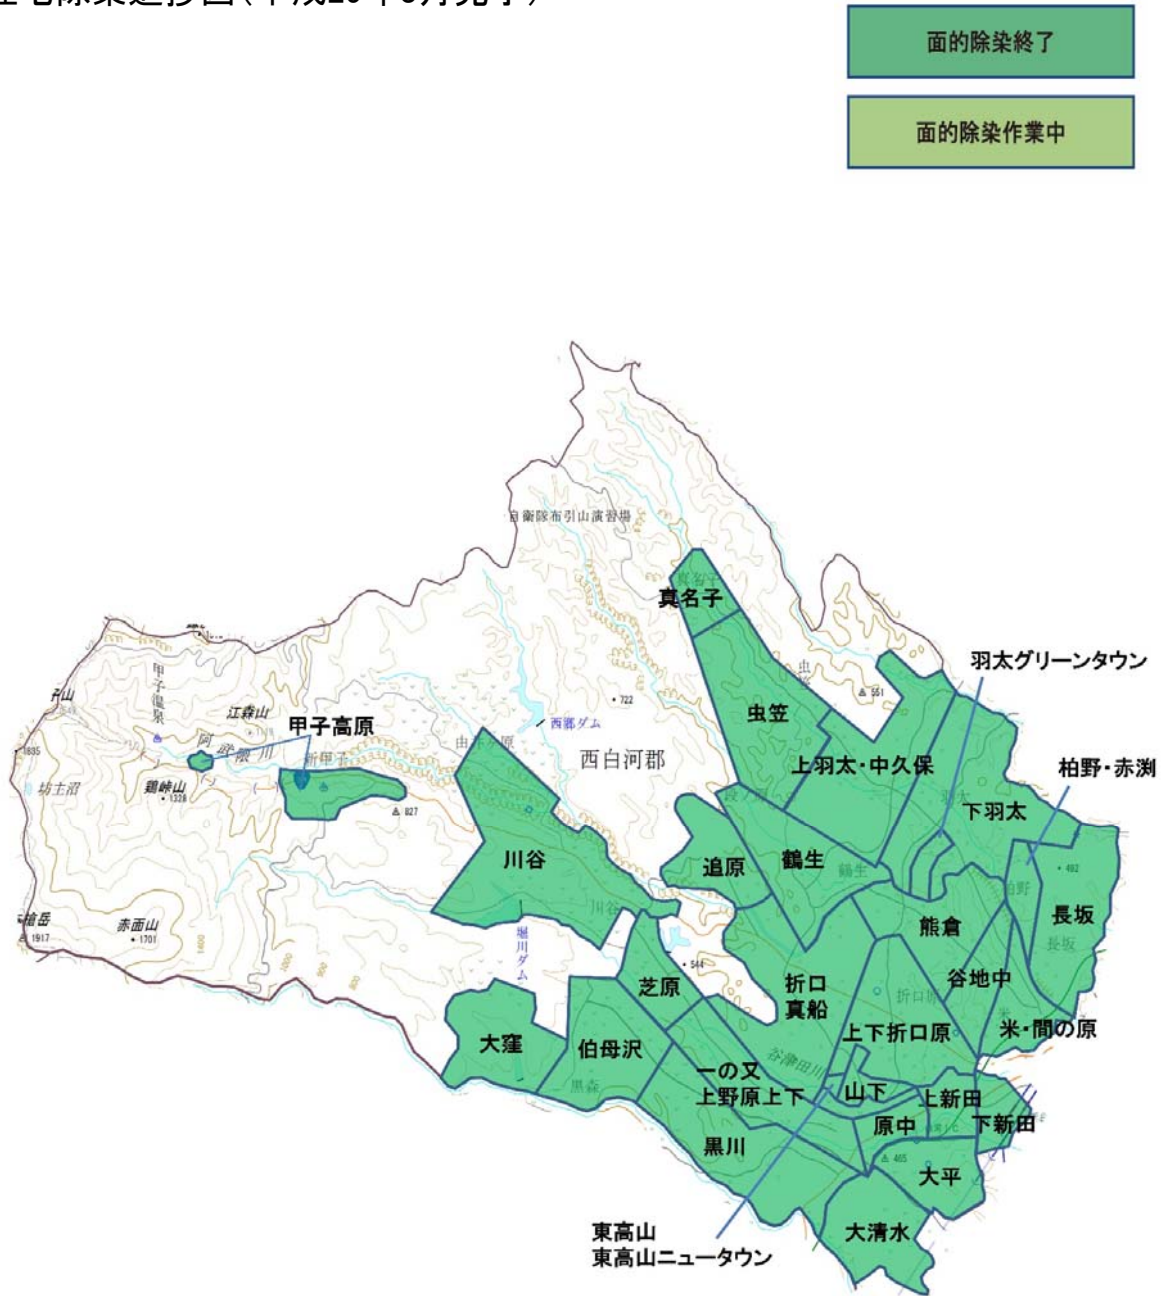

## 計画数に対する除染の進捗状況(平成29年3月完了)

住宅(戸)	
進捗数	7,610 (100.0%)
発注数	7,610 (100.0%)
計画数	7,610

公共施設等(施設数)	
進捗数	373 (100.0%)
発注数	373 (100.0%)
計画数	373

道路(km)	
進捗数	207.5 (100.0%)
発注数	207.5 (100.0%)
計画数	207.5

農地(水田+畑地+樹園地+牧草地:ha)	
進捗数	238.0 (100.0%)
発注数	238.0 (100.0%)
計画数	238.0

森林(生活圏)(ha)	
進捗数	129.5 (100.0%)
発注数	129.5 (100.0%)
計画数	129.5



汚染土壌剥ぎ取り作業



住宅敷地内の除染作業

## 仮置場の整備状況(平成28年12月末時点)

搬入済み	0ヶ所
搬入中	3ヶ所
搬入前	0ヶ所



仮置場造成の様子



仮置場での保管の様子
