


市町村除染地域における除染実施状況(平成27年4月末時点)

1 調査概要

本調査は、各市町村における除染の実施状況を一体的に把握し、事業規模の把握、除染状況の可視化及び情報発信による住民理解の促進等に活用することを目的として平成24年4月から実施している。住宅、公共施設、道路、水田等の除染対象区分ごとに、平成23年度から平成27年4月末時点での計画数、発注数、実施数の累計を各市町村からの情報に基づき集計したもの。


2 平成27年度末までの計画数に対する除染の進捗状況

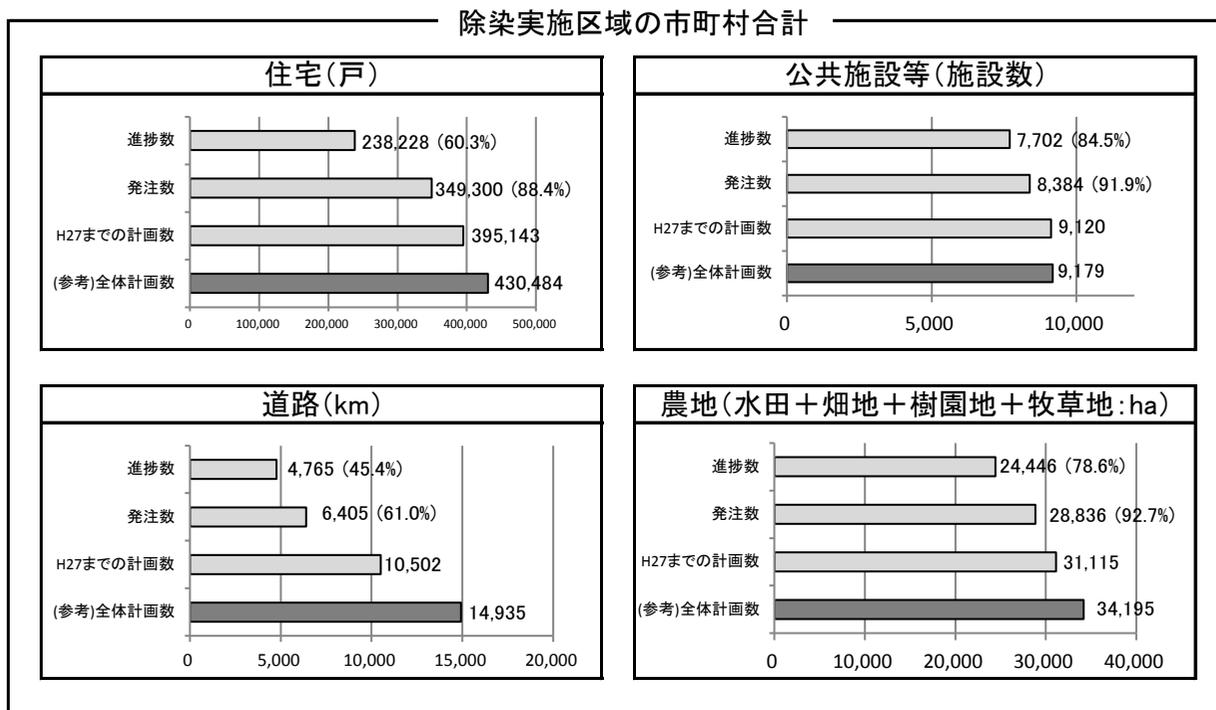

※ 計画数については、今後の精査によって変更されることがあります。

[住宅の除染]

- 平成27年度末までの計画数395,143戸に対して発注数が349,300戸(88.4%)、除染実施数(205,537戸)と調査にて終了(32,691戸)を合わせた進捗数は238,228戸(60.3%)となっている。
なお、全体計画数430,484戸に対する発注率は81.1%、進捗率は55.3%となっている。

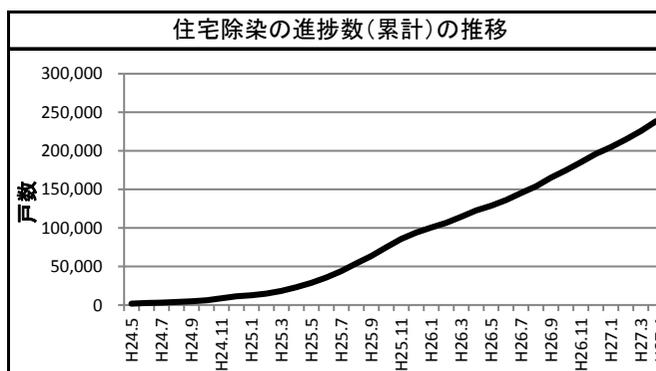

[公共施設等の除染]

- 平成27年度末までの計画数9,120施設に対して発注数が8,384施設(91.9%)、除染実施数(6,767施設)と調査にて終了(935施設)を合わせた進捗数は7,702施設(84.5%)となっている。
なお、全体計画数9,179施設に対する発注率は91.3%、進捗率は83.9%となっている。

[道路の除染]

- 平成27年度末までの計画数10,502kmに対して発注数が6,405km(61.0%)、除染実施数(4,190km)と調査にて終了(575km)を合わせた進捗数は4,765km(45.4%)となっている。
なお、全体計画数14,935kmに対する発注率は42.9%、進捗率は31.9%となっている。

[農地(水田+畑地+樹園地+牧草地)の除染]

- 平成27年度末までの計画数31,115haに対して発注数が28,836ha(92.7%)、実施数が24,446ha(78.6%)となっている。
なお、全体計画数34,195haに対する発注率は84.3%、進捗率71.5%となっている。
