


労働環境改善スケジュール

資料1

分類	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		11月		12月				1月				2月			3月			備考	
			26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	下	上	中	下	上	中	下			
防護装備	1	防護装備の適正化検討  ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、休憩所や装備交換所で、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による安全性と作業性の向上を図る。	検討・設計	管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討																		
			現場作業	管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化																		
人身安全	2	重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握  ※協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価	検討・設計	情報共有、安全施策の検討・評価																		
			現場作業																			
健康管理	3	長期健康管理の実施  ※検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き	検討・設計	健康相談受付																		
			現場作業	【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用精算手続き																		
労働環境改善	4	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化  ※1F救急医療室の2018年3月までの医師確保完了	検討・設計	1F救急医療室の1～3月の勤務医師調整																		
			現場作業	1F救急医療室3月までの医師確保完了																		
委員管理、労働環境改善	5	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握  ※作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	検討・設計	作業員の確保状況(11月実績/1月予定)と地元雇用率(11月実績)についての調査・集計																		
			現場作業	作業員の確保状況(12月実績/2月予定)と地元雇用率(12月実績)についての調査・集計																		
労働環境改善	6	労働環境・生活環境・就労実態に関する企業との取り組み  ※労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握	検討・設計	労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック																		
			現場作業	作業員へのアンケートによる実態把握(第8回)																		
車両点検整備	7	構内専用車両の点検整備  ※未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定	検討・設計	未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定(1月分)																		
			現場作業	未点検の構内専用車両の整備の実施																		

分野 活 り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		11月						12月						1月						2月		3月		備 考
		26	3	10	17	24	31	7	14	下	上	中	下	前	後											

労働環境改善

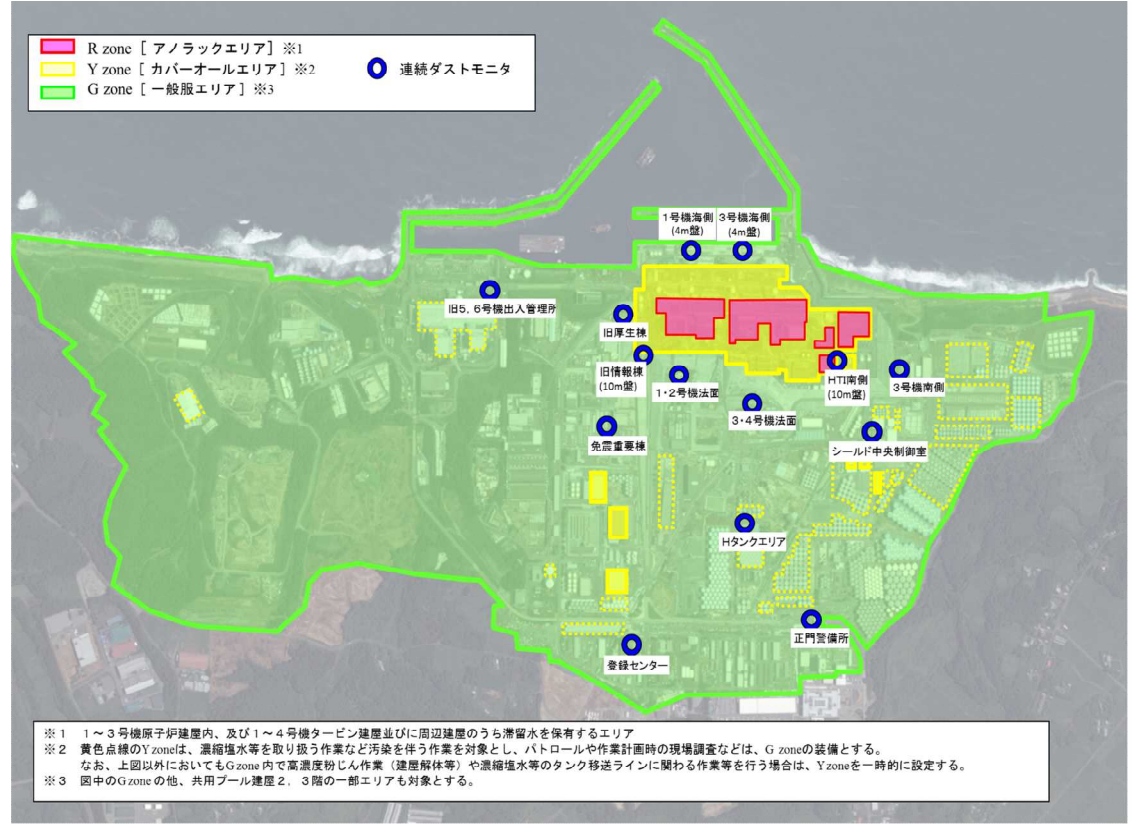

管理対象区域の運用区分 レイアウト

提供：日本スペースイメージング、©DigitalGlobe
