

## 3号機タービン建屋雨水対策



2020年12月22日

東京電力ホールディングス株式会社

# 雨水対策の現況について：建屋屋根雨水対策状況（全体）




- 3号機タービン建屋（T/B）の雨水対策は、2020年7月8日に流入防止堰の設置、8月7日に雨水カバーの設置完了。



屋根損傷部

3号機T/B上屋 屋根状況【着手前】

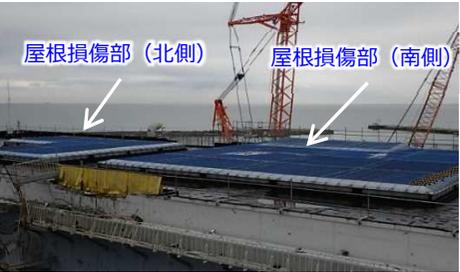

屋根損傷部（北側） 屋根損傷部（南側）


屋根状況【流入防止堰・雨水カバー設置完了】

【凡例】

- 雨水対策実施予定
- 汚染源除去対策済
- カバー屋根等設置済
- 陸側遮水壁
- 浄化材
- 雨水排水先


**2020.7.8 流入防止堰設置完了**  
**2020.8.7 雨水カバー設置完了**

R/B : 原子炉建屋  
 T/B : タービン建屋  
 Rw/B: 廃棄物処理建屋  
 C/B : コントロール建屋  
 S/B : サービス建屋

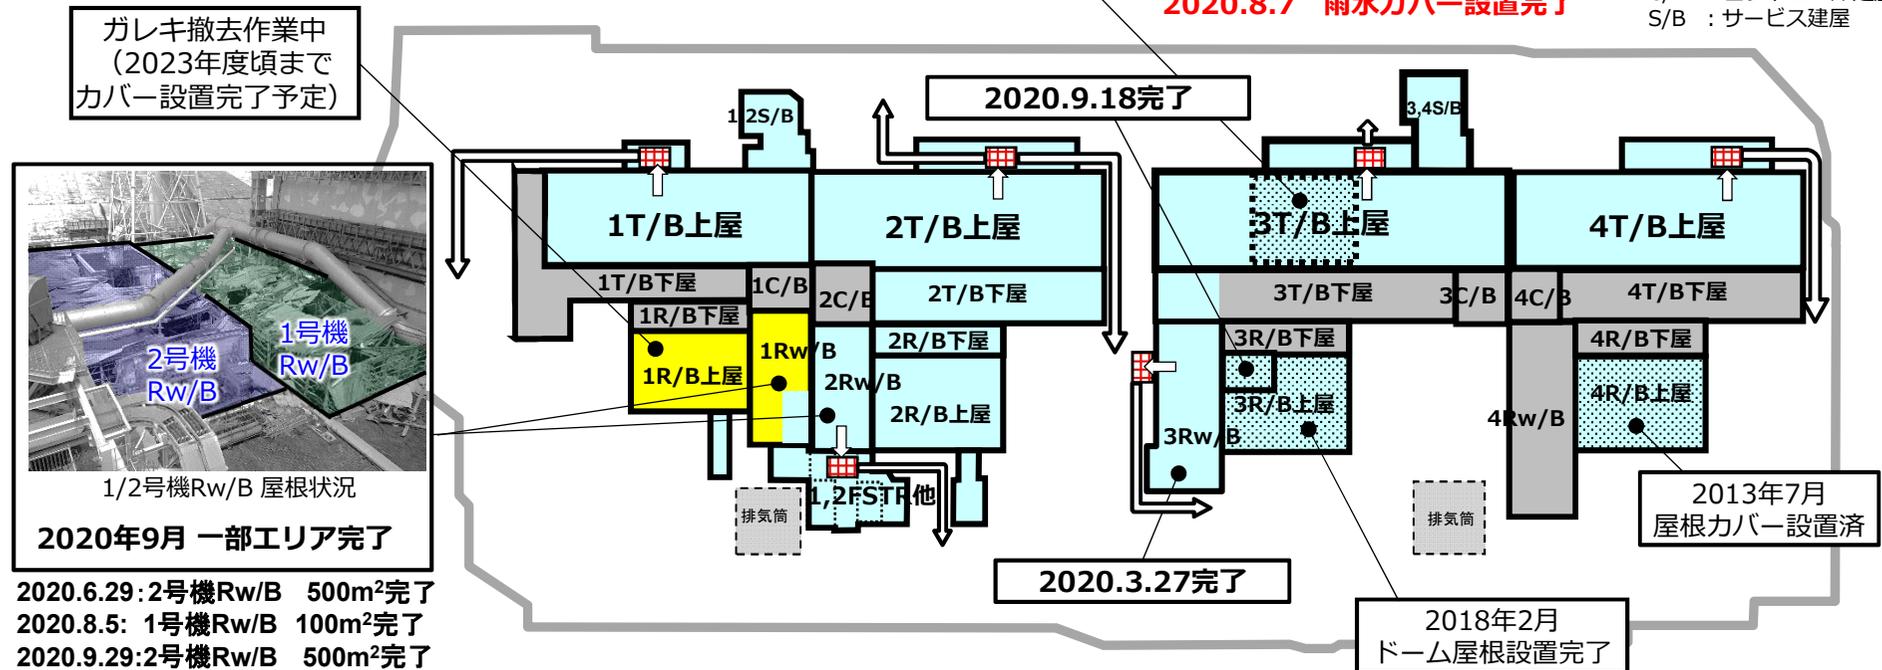

# 3号機タービン建屋 (T/B) の状況


- 汚染源除去対策として、3,4号機増設サービス建屋 (S/B) 、3号機T/B低層部、3号機T/B上屋のガレキ撤去完了。(2020年10月)
- 雨水対策として、2020年7月8日に流入防止堰の設置完了。8月7日に雨水カバーの設置完了。  
→ 屋根対策の効果については、施工後3ヵ月であること並びに降雨が少ないことから、今後も監視を継続<手順> していく。




クレーンヤード整備完了



3号機T/B上屋 ガレキ撤去状況

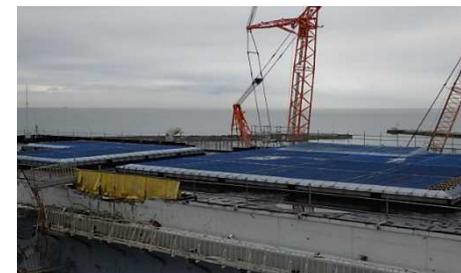

屋根状況【流入防止堰・雨水カバー設置完了】

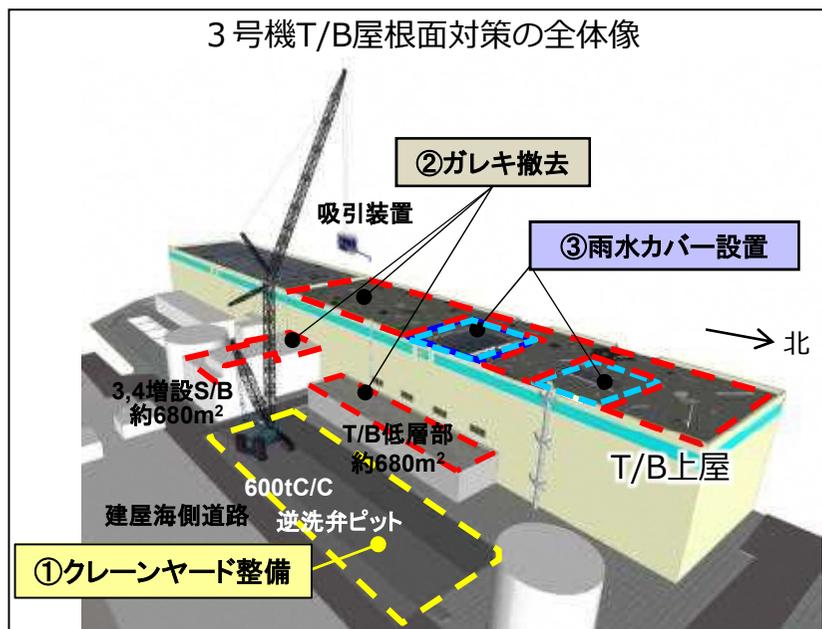


	2018年度		2019年度				2020年度							
	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
3号機 T/B	クレーンヤード整備		ガレキ撤去											
							流入防止堰設置							
							雨水カバー設置							
							浄化材設置、防水塗装							

## ＜参考＞ 3号機タービン建屋（T/B） ・ 雨水対策の実施状況

- 2018年10月から、3号機タービン建屋東側のヤード整備を開始。
- 2020年5月から、流入防止堰の設置を開始。7月20日から雨水カバーの設置作業を開始し、8月7日に完了。



3号機タービン建屋・屋根状況【着手前】  
〔西側から撮影〕

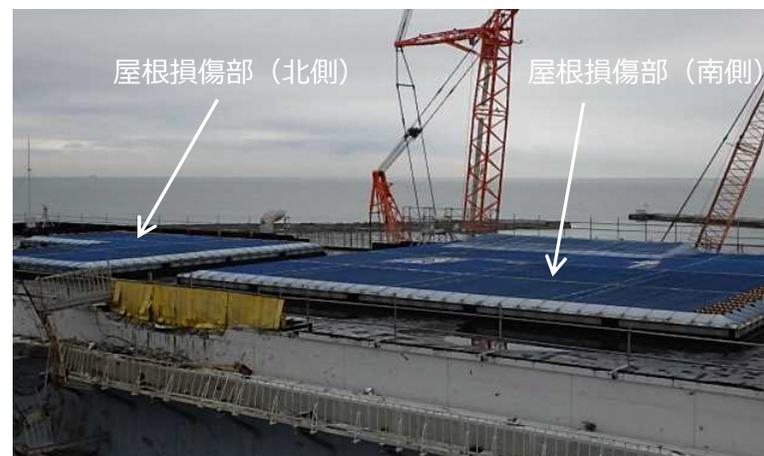

屋根状況【流入防止堰・雨水カバー設置完了】  
〔西側から撮影〕



〔北側から撮影〕



〔北側から撮影〕



〔北側から撮影〕
