



逢瀬川通信

VOL. 14(令和7年11月発行)
発行元：福島県県中建設事務所河川砂防課

福島県が進めている一級河川逢瀬川河川改修事業の進捗状況や今後の予定などについてお知らせするため、「逢瀬川通信」を発行しています。
住民の皆さまにはご不便おかけしますが、河川改修工事にご協力をお願いします。

お知らせ

咲田橋架替工事の状況

咲田橋は、令和5年9月から車両通行止めにして架替え工事を実施しています。令和7年8月末までに橋脚を作るための栈橋と矢板を撤去し、橋梁下部工（橋台・橋脚）が完成しました。現在は、橋梁上部工（橋桁）の工場製作を進めており、12月には橋桁の架設工事を行う予定です。大型クレーンによる現地の作業工程が決定しましたら、周辺に案内看板を設置してお知らせします。
咲田橋の供用開始は令和8年12月頃を予定していますので、引き続き工事へのご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。




若葉町側

富久山町久保田側

咲田橋架替工事の状況 (R7.9.25撮影)



完成した橋脚と若葉町側の工事状況 (R7.10.28撮影)

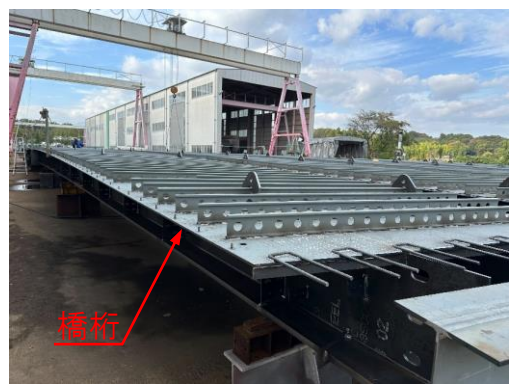

製作中の橋桁 (R7.10.29撮影)

咲田橋架替工事の工程

	令和7年度						令和8年度
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
工場製作	←→						
橋桁架設			←→				
床板・高欄等				←→			
舗装・道路改良工事等							←→

R8.12
供用開始予定
★
