
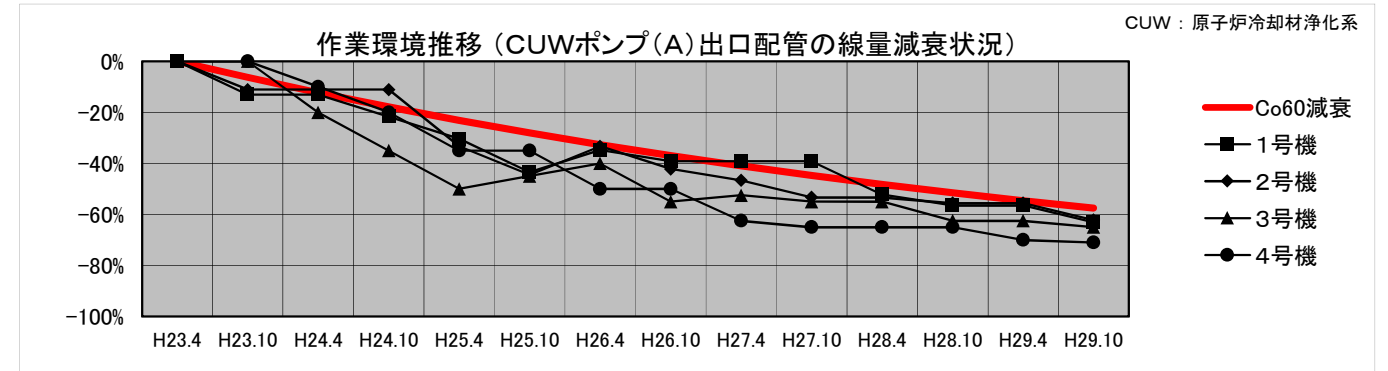
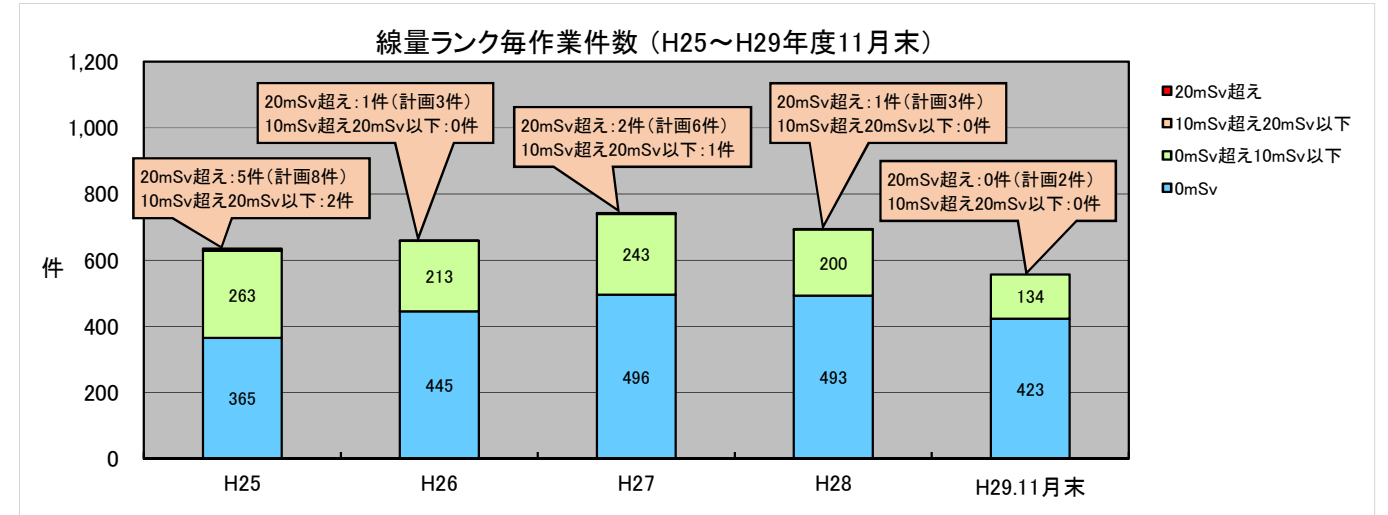
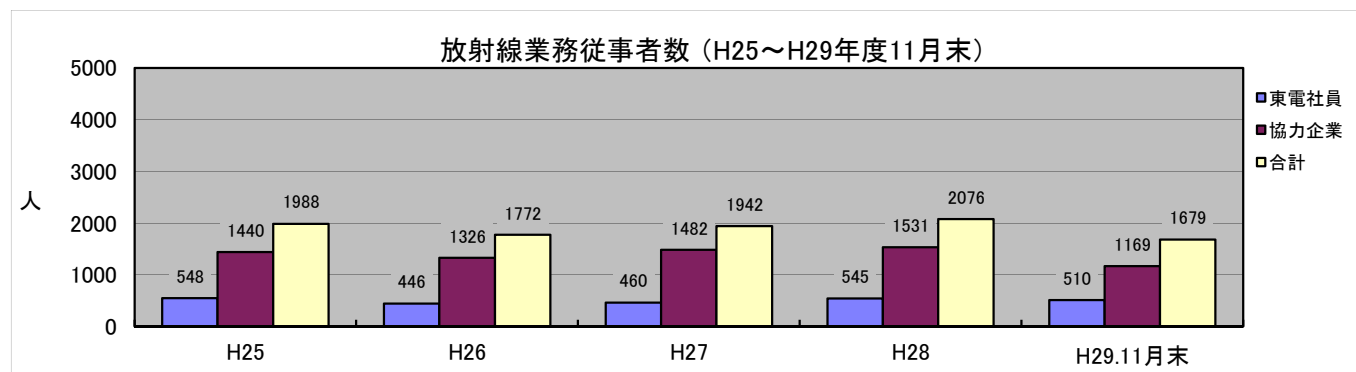
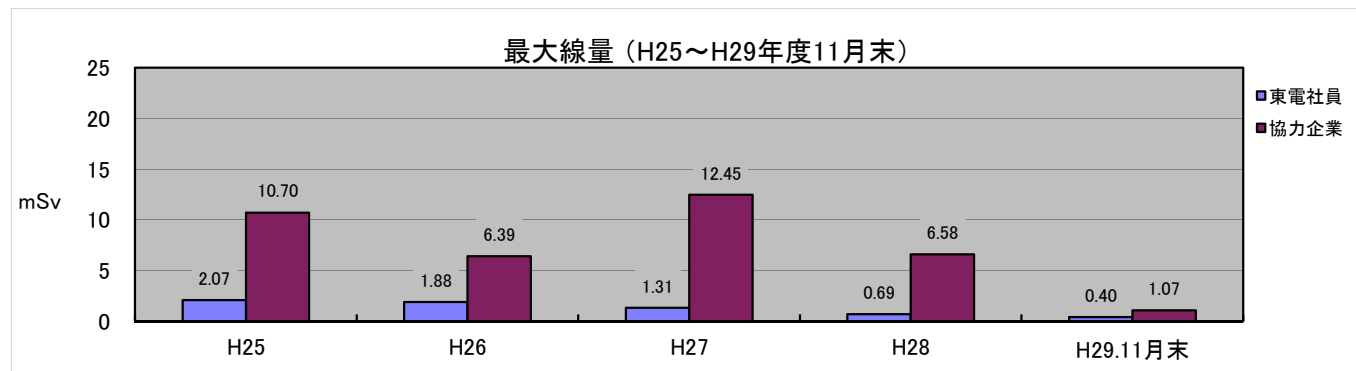
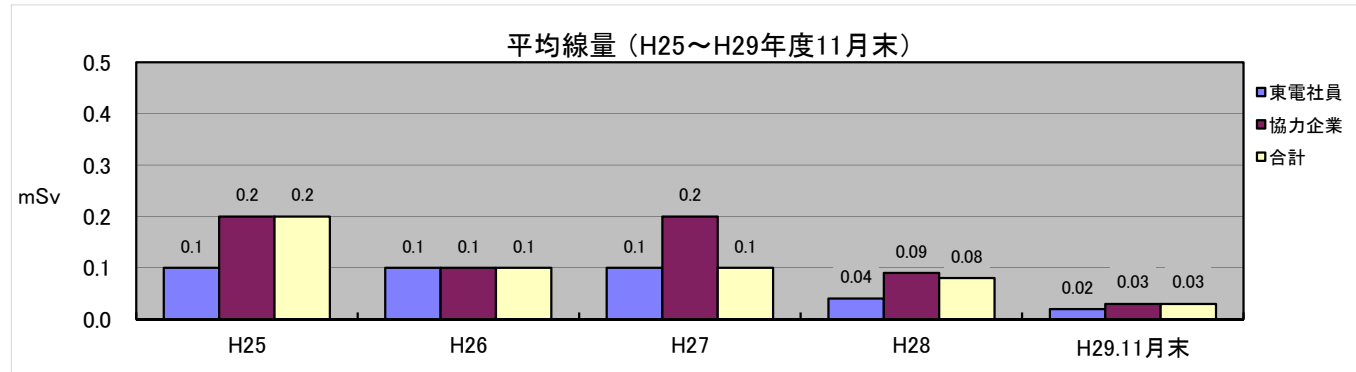
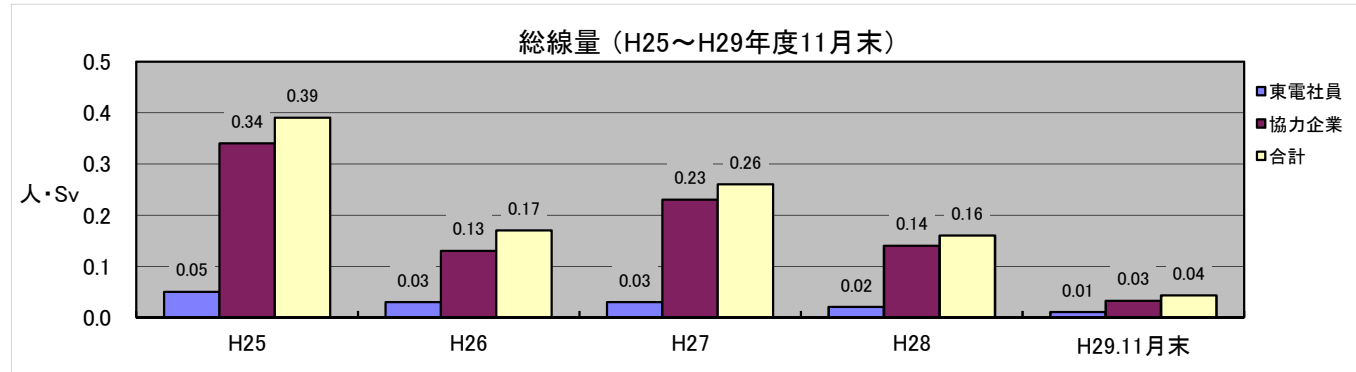


# 福島第二原子力発電所 放射線業務従事者数および線量状況について

平成30年1月23日  
東京電力ホールディングス(株)  
福島第二原子力発電所

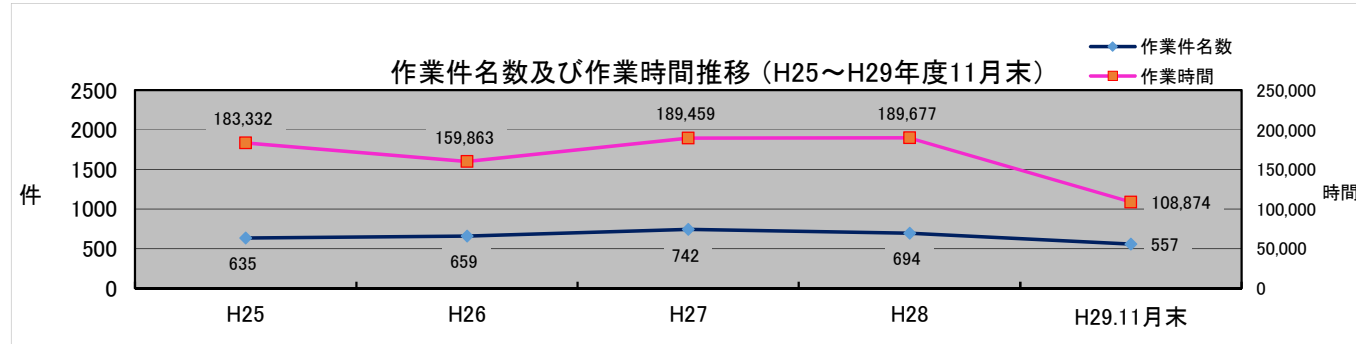

### 【平成29年度11月末実績について】

◆前年度との比較

比較項目	平成28年度11月末	平成29年度11月末	比較(H29-H28)
作業件数	572 件	557 件	▲ 15 件
作業時間	117,874 時間	108,874 時間	▲ 9000 時間
総線量	0.09 人・Sv	0.04 人・Sv	▲ 0.05 人・Sv
平均線量	0.05 mSv	0.03 mSv	▲ 0.02 mSv
最大線量	東電社員 0.59 mSv 協力企業 3.51 mSv	東電社員 0.40 mSv 協力企業 1.07 mSv	▲ 0.19 mSv ▲ 2.44 mSv
放射線業務従事者数	1737 人	1679 人	▲ 58 人
総線量が10人・mSvを超える作業件数	1 件	0 件	▲ 1 件

◆考察

- 平成29年度11月末実績は、前年度と比較して作業量の減少や作業環境線量の自然減により、総じて減少している。特に協力企業の個人最大線量については、平成28年度に実施したサプレッションチェンバ点検の影響が大きかったため、大幅に減少している。
- 今年度の作業として予想総線量が20人・mSvを超えているサプレッションチェンバ修理については、放射線管理計画書の事前ヒアリングを実施し、線量低減対策等の詳細を確認した。また、低減対策が確実に実施されていることを作業中の現場パトロールで確認した。

※平成29年度に実施している線量低減活動

- 予想総線量が20人・mSv以下の作業
  - ・作業前に提出される放射線管理計画書で線量低減対策等の計画を確認するとともに、追加または改善できる線量低減対策があれば協力企業に提案、指導助言を行う。
  - ・日々の線量実績を確認し、日計画線量に対する超過者の有無などを確認する。
  - ・作業後に提出される放射線管理報告書で線量低減対策等の実績を確認するとともに、次回作業や他号機作業への反映事項がある場合は、それらを展開する。
- 予想総線量が20人・mSvを超える作業（平成29年度は2件実施予定）
  - ・上記予想総線量が20人・mSv以下の作業における線量低減対策に加え以下を実施。
  - ・放射線管理計画書の事前検討会を協力企業と実施し、作業内容・作業手順・作業環境・日計画線量・線量低減対策等を詳細に確認する。
  - ・作業の進捗に応じて予想線量に対する実績を確認する。また、線量低減対策の実施状況を現場パトロールで確認し、改善すべき内容があれば協議する。
- 個人線量目標の導入
  - ・個人線量目標を設定し(平成29年度は2.5mSv/年)、目標値を下回るように管理する。
