


福島駅前通り工事進捗状況

事業概要

路線名 福島停車場線(福島駅前通り) 福島県福島市栄町地内
 延長 L=230m
 幅員 W=車線部6.0m(全幅20.0m)
 内容 現況道路幅員の中で歩道、車道等を再配置します。車道は2車線を確保し型押しアスファルト舗装、歩道は拡幅し、インターロッキングブロック舗装とします。
 工期 平成28年11月～平成30年3月

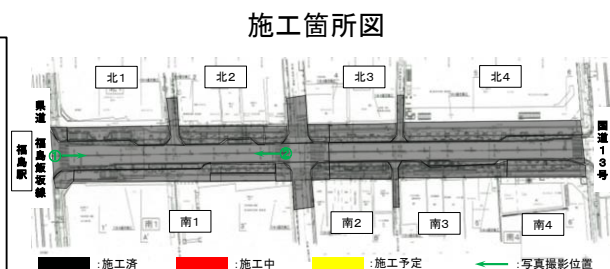

完成了ました！

現場状況写真

①施工前(平成29年1月10日撮影)



竣工(平成30年3月25日撮影)



福島駅前から国道13号方面を望む

②施工前(平成29年1月10日撮影)



竣工(平成30年3月25日撮影)



セブンイレブン交差点から福島駅方面を望む

お知らせ

平成30年4月8日(日)午前10時より、「Fukushimaハルフェス」のオープニングセレモニーが「リニューアル完成記念」と銘打って開催されます。
