


福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 日時
平成30年11月7日（水）
- 2 確認箇所
サブドレン集水設備（No.4 中継タンク及び移送配管）
- 3 確認項目
サブドレン集水設備（No.4 中継タンク及び移送配管）の清掃状況

4 確認結果の概要

サブドレン集水設備は、地下水中に含まれる鉄分の影響で配管や中継タンクに付着物が発生しており、設備の能力を維持するために、定期的な清掃により配管等の付着物を除去している。今回、No.4 中継タンク廻りで行われている移送配管等の清掃状況を確認した。

- ・No.4 中継タンクの清掃は終了しており、タンク内部の付着物は除去されていた。（写真1）
- ・付着物を除去した移送配管（鋼管）の点検や組立作業等が行われていた。（写真2）

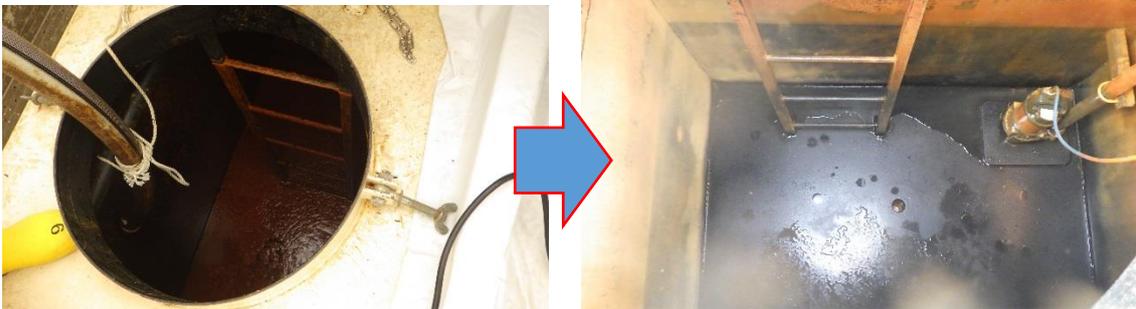

（写真1）No.4 中継タンクの清掃前後の状況
（清掃前：平成30年11月5日撮影） （清掃後：平成30年11月7日撮影）



（写真2-1）付着物除去後の移送配管（鋼管）の状況



(写真 2 - 2)
付着物除去後の移送配管（鋼管）の
組み立て作業の状況

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。
