

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年4月13日（金）

2 確認箇所

4号機原子炉建屋南西側

3 確認項目

凍土遮水壁（陸側遮水壁）の内外水位差の状況


4 確認結果の概要

凍土遮水壁の効果を視覚的に確認するために設けられた堅穴の状況を確認した。

- ・ 4号機原子炉建屋の南西側に井戸が2つあり、片方は凍土遮水壁の外側、もう片方は内側に設置されていた。
- ・ 凍土遮水壁の外側の井戸は地下水を確認できたが、凍土遮水壁の内側の井戸については、地下水を確認できなかった。



(写真1)凍土遮水壁外側の井戸

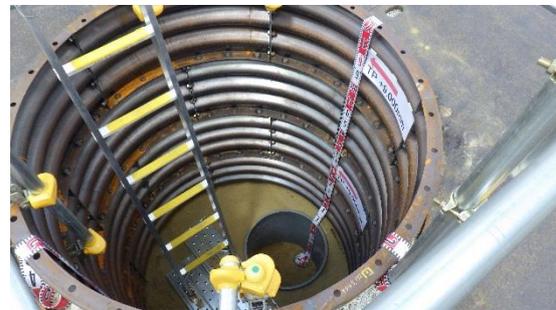

(写真2)凍土遮水壁内側の井戸

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。
