

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年 6月 4日 (月)

2 確認箇所

K1タンクエリア周辺

3 確認項目

K1タンクエリア周辺の側溝の状況

4 確認結果の概要

K1タンクエリア周辺において、側溝の敷設状況や排水路への接続状況について確認した。

- ・ K1タンクエリアの東側に側溝が敷設されており（写真1）、K1タンクエリアの周辺に降った雨水は、その側溝に流れ込み、K1タンクエリア南側にあるB排水路に流れ込むことが確認された（写真2）。
- ・ K1タンクの西側の道路（K1タンクエリアとK2タンクエリアに挟まれた道路）の両脇にも側溝が敷設されており、両方ともB排水路へ流れ込むようになっていた。（写真3）




(写真1)



(写真2)



(写真3-1)

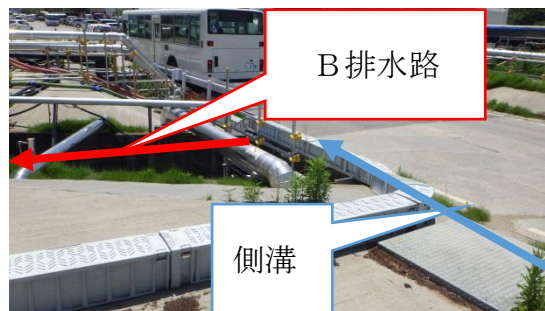

(写真3-2)

5 プラント関連パラメータ確認

○各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。
