


福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
令和2年8月21日（金）
- 2 確認箇所
1 / 2号機タービン建屋東側
- 3 確認項目
1 / 2号機タービン建屋東側のフェーシング工事の状況
- 4 確認結果の概要

放射線量率低減による作業環境の改善や雨水の地下浸透を抑制し建屋内への地下水流入量の低減を目的として、建屋周りではガレキの撤去や道路等の整備及びフェーシング（以下、「フェーシング工事等」という。）が行われている。1 / 2号機タービン建屋東側について、令和2年7月末からフェーシング工事等が開始されていることから状況を確認した。（図1）

- ・現場確認時、1号機タービン建屋東側、2号機タービン建屋東側ともにフェーシング工事等の作業は実施されていなかったが、準備工事である支障物撤去作業や除草作業等は進捗していた。（写真1）

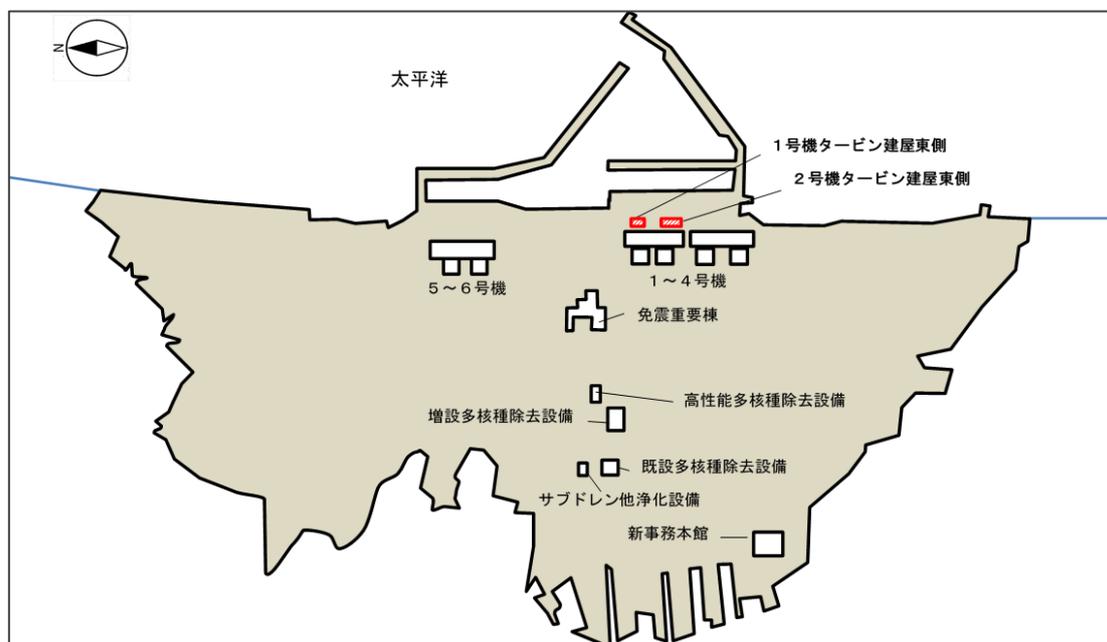

（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)

1号機タービン建屋東側の状況
(北東側から撮影)



(写真1-2)

2号機タービン建屋東側の状況
(北東側から撮影)

5 プラント関連パラメータ等確認

本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。
