

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

平成31年1月30日（水）

### 2 確認箇所

サブドレン他浄化装置


### 3 確認項目

サブドレン他浄化装置の吸着塔交換作業の状況

### 4 確認結果の概要

本日（1月30日）、サブドレン他浄化装置B系の吸着塔の交換が行われたことから、作業状況を確認した。

- ・定められた手順により、交換する使用済吸着塔からの配管取り外し、閉止フランジの取り付け、使用済吸着塔の運搬用低床トレーラーへの積載及び新しい吸着塔の据付、配管の取り付けなどの作業がトラブルなく実施された。（写真1）
- ・低床トレーラーの運搬用架台に積載された使用済吸着塔は、転倒防止対策として、ボルトによる固定やワイヤーでの固縛が行われて、構内の一時保管施設に運搬された。（写真2）

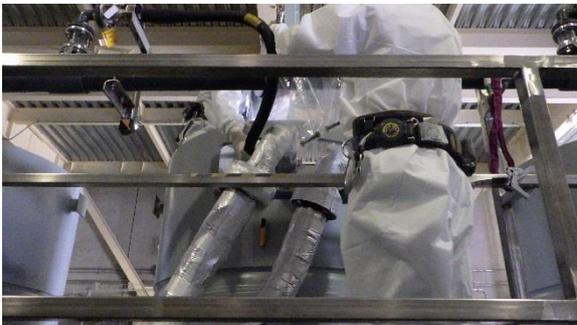

（写真1-1）

使用済吸着塔の配管取り外し状況



(写真1-2)

新しい吸着塔の天井クレーンによる移動状況



(写真2)

使用済吸着塔の搬出状況

- 5 プラント関連パラメータ等の確認  
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。
