


## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日  
平成30年 8月24日 (金)
- 2 確認箇所  
第三セシウム吸着装置(サイトバンカ建屋)
- 3 確認項目  
第三セシウム吸着装置における第二セシウム吸着装置からの変更点
- 4 確認結果の概要  
第三セシウム吸着装置は、現在試運転中であり、これまでも現場を確認している。(前回確認：平成30年7月13日)  
当該装置は、第二セシウム吸着装置からの改善点の一つである残水処理に関して、腐食リスク低減のため吸着塔最下部から排水が可能な構造としたことから、今回その設備について確認した。(写真1、2)  
・吸着塔の上部に必要な配管が接続されていることを確認した。(写真2)



(写真1)  
左側2塔：ろ過フィルタ  
右側4塔：吸着塔

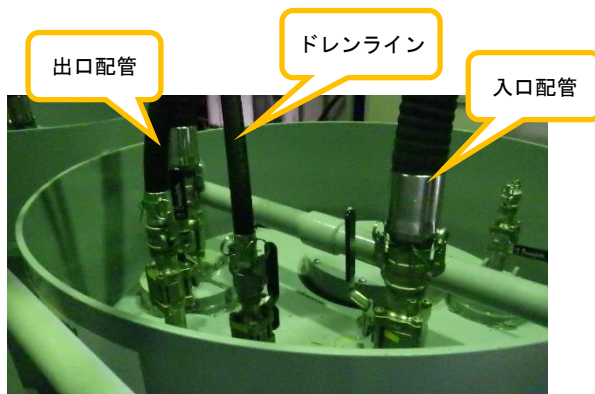

(写真2) 吸着塔上部配管を撮影。  
出口配管から排水後、この弁を閉じ、入口配管から空気を送り、最下部の残水をドレンラインから排出する。

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。
