

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
平成31年4月3日（水）
- 2 確認箇所
H3タンクエリア
- 3 確認項目
地下水バイパス一時貯留タンクエリア水溜まり発生事象の再発防止対策の実施状況


4 確認結果の概要

平成31年1月15日に発見された地下水バイパス一時貯留タンクエリア（H3タンクエリア東側）外堰の水溜まり発生事象については、再発防止対策として、外堰表面防水塗装の補強塗装等を実施することになっていることから、前回に引き続き、対策工事の実施状況を確認した。

（前回確認：[平成31年3月13日](#)）

- ・前回確認時は、東側外堰の南東側の一部に補強塗装の下地が施工されるとともに、東側外堰の内側側溝及び周縁が防水塗装されていたが、今回確認時は、同箇所も含めて東側外堰全体の補強塗装等が完了していた。

（写真1）

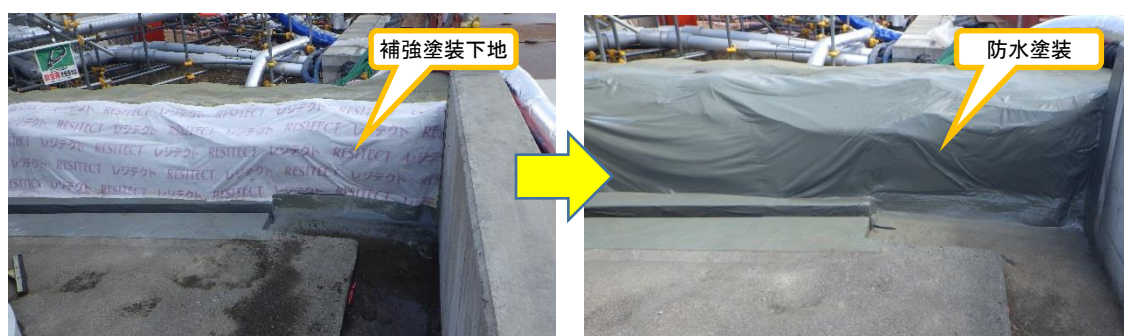

（写真1-1）

前回撮影（平成31年3月13日）

（写真1-2）

今回撮影（平成31年4月3日）

（東側外堰南東部の内側を撮影）

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。
