


福島第一原子力発電所現地確認報告書


- 1 確認日
令和2年12月4日（金）
- 2 確認箇所
Fタンクエリア（5／6号機浄化ユニット）
- 3 確認項目
5／6号機滞留水貯留設備浄化ユニットC配管フランジ部からの水の漏えいに関する対応状況
- 4 確認結果の概要
前回（10月13日）に引き続き、8月14日に漏えいがあった5／6号機の滞留水貯留設備浄化ユニットCの状況を確認した。（図1）
 - ・当初は10月下旬にフランジの復旧がなされるとのことであり、現場を確認したが、現時点でフランジは復旧されていなかった。
 - ・漏えいが確認された浄化ユニットCの吸着塔は前回と同様に上部全体に袋養生がなされ、配管が取り外されていた。（写真1）
 - ・事象発生時には浄化ユニットの漏えいパン内に水が溜まっていたが、今回確認時には漏えいパン内に水は確認されなかった。（写真2）



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図

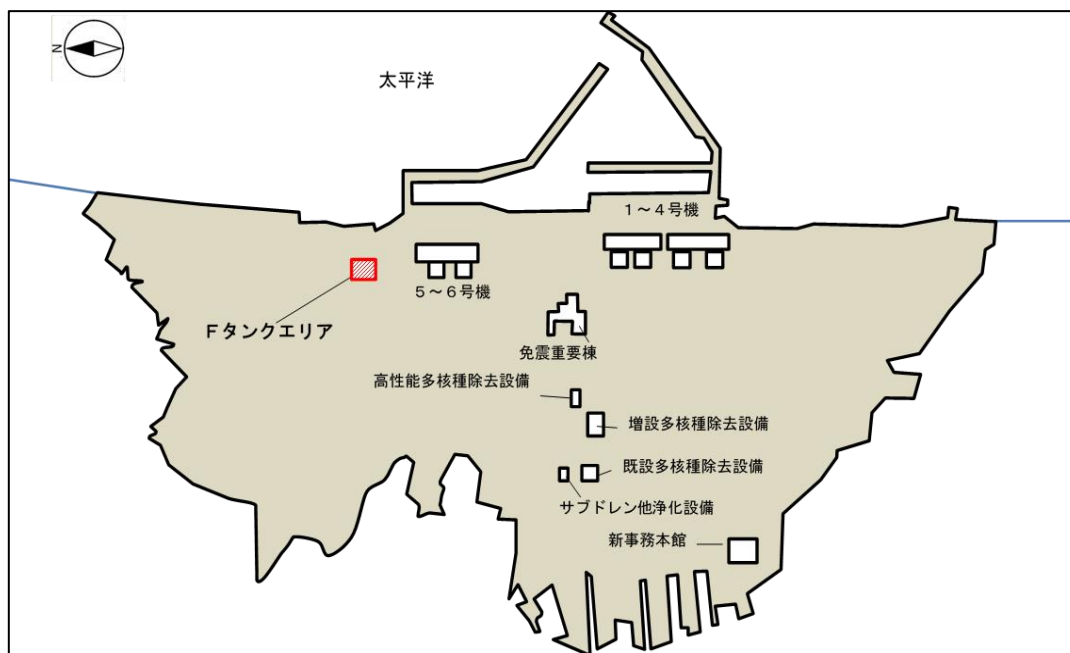

(写真1-1)
吸着塔上部の状況
配管が取り外されており、復旧されて
いなかった

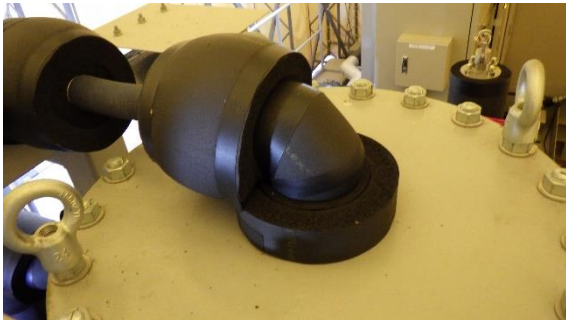

(写真1-2)
健全な配管の様子
(浄化ユニットA吸着塔上部)



(写真2)
漏えいパン内の状況

5 プラント関連パラメータ等確認

本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。
