


福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
令和3年7月2日（金）
- 2 確認箇所
H9及びH9西タンクエリア
- 3 確認項目
H9及びH9西タンクエリアのフランジ型タンクの解体状況

4 確認結果の概要

福島第一原子力発電所では、ボルト締めフランジ型タンクの解体を順次進めており、前回（令和3年4月20日）に引き続き、H9及びH9西タンクエリアの作業状況を確認した。（図1）

- ・前回確認時には全12基のタンクの解体完了を確認しており、堰の解体作業が行われていた。今回確認した結果、コンクリートがらの撤去及び均しが実施されたエリアが見られ、堰の解体作業が進捗していた。（写真1）
- ・現場確認時には基礎のはつり作業、コンクリートがらの集積作業、鉄筋の減容作業が行われていた。（写真2）

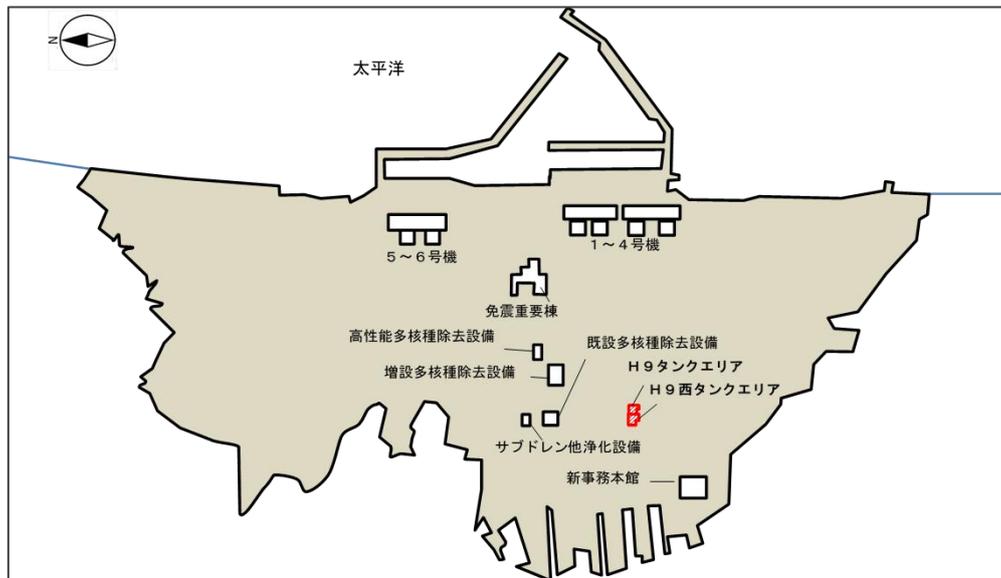

（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真 1 - 1)
前回の状況
(令和 3 年 4 月 20 日撮影)



(写真 1 - 2)
今回の状況
コンクリートがらの撤去、均しが実施されていた



(写真 2 - 1)
基礎のはつり作業の状況



(写真 2 - 2)
コンクリートがらの集積作業の状況



(写真 2 - 3)
鉄筋の減容作業の状況

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。
