

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和2年12月11日（金）

2 確認箇所

1号機原子炉建屋東側建屋残置カバー解体ヤード


3 確認項目

1号機原子炉建屋残置カバー解体作業の進捗状況の確認


4 確認結果の概要

1号機原子炉建屋の使用済燃料プールからの燃料取り出しに向けて、大型カバーを設置するため、干渉する残置カバーの解体が12月から予定されていることから、作業の進捗状況を確認した。（図1）


- ・1号機原子炉建屋の残置カバーの解体範囲は防風フェンス、ミスト散水設備、建屋カバー梁、建屋カバー柱である。（写真1）
- ・現場確認時には解体ヤードの整備作業として敷鉄板の敷設作業が行われていた。（写真2）
- ・解体ヤードの周辺にはカバー解体時に使用する遮へい板や小割した残置カバーを詰めるコンテナが置かれていた。（写真3）

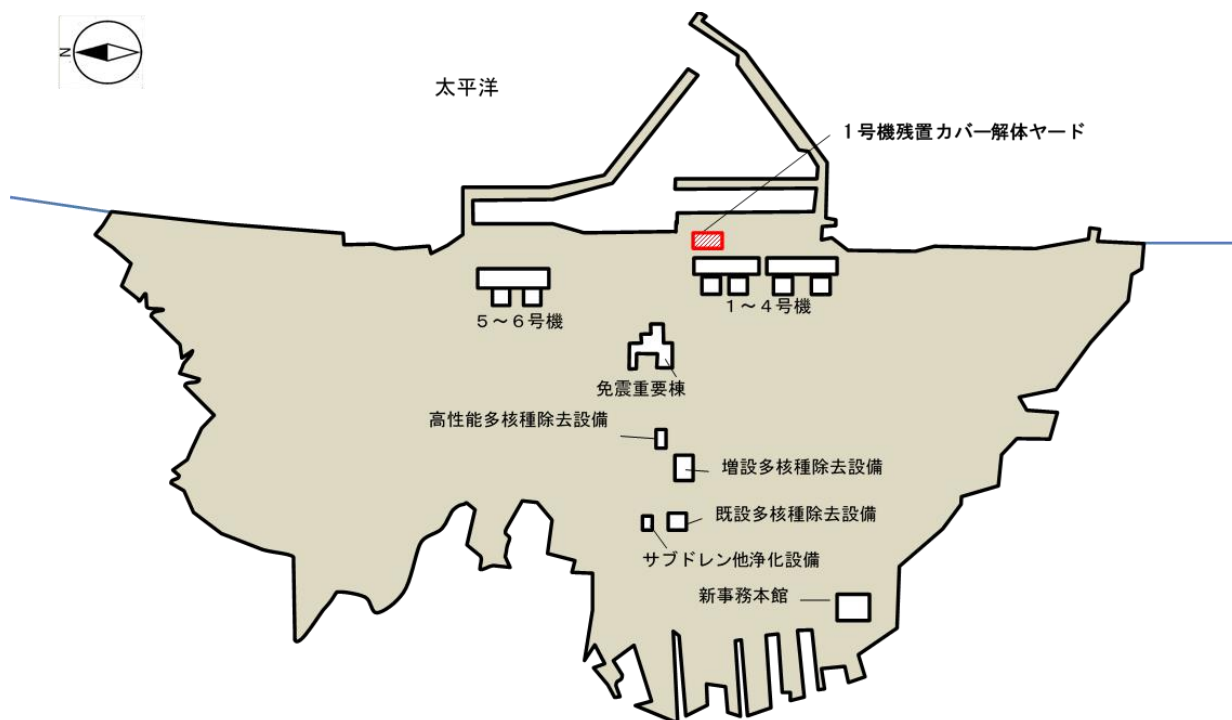

（図1）福島第一原子力発電所構内概略図

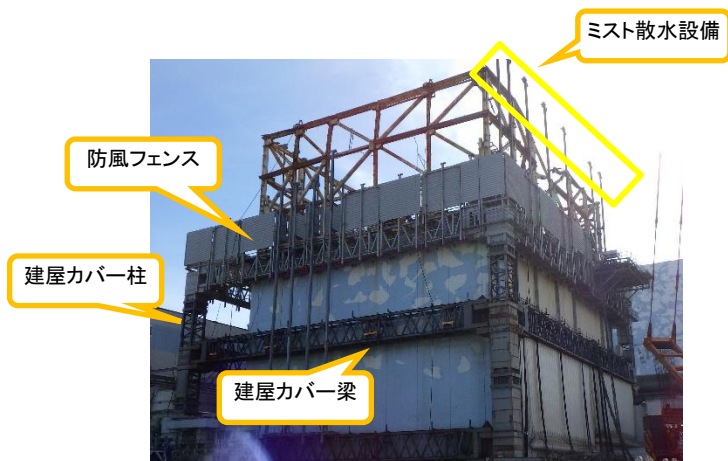

(写真1)
1号機原子炉建屋の現況

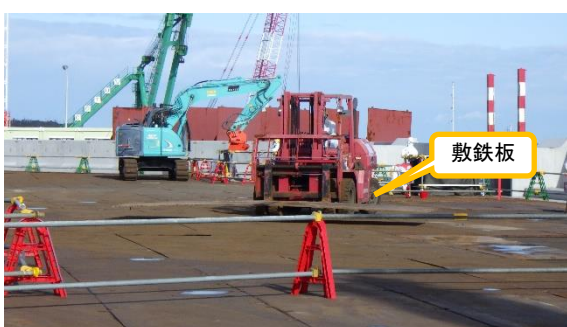

(写真2)
建屋残置カバー解体ヤードの整備作業の様子



(写真3-1)
解体作業時に設置される遮へい板



(写真3-2)
小割した残置カバーを詰めるコンテナ

5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。
