

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和元年12月9日（月）

2 確認箇所

G4北タンクエリア

3 確認項目


G4北タンクエリアの現況

4 確認結果の概要

6基のフランジ型タンクが設置されているG4北タンクエリア（図1、写真1）の現況を確認した。

- ・当該タンクエリアのフランジ型タンクには多核種除去設備の処理水が貯留されていたが、貯留水の移送及び残水処理が完了し解体が計画されている。
- ・解体作業時に干渉する移送配管は既に撤去されており、仕切弁に閉止フランジが設置されていた。（写真2）
- ・タンクの連結管も撤去されており、閉止フランジが設置されていた。

（写真3）

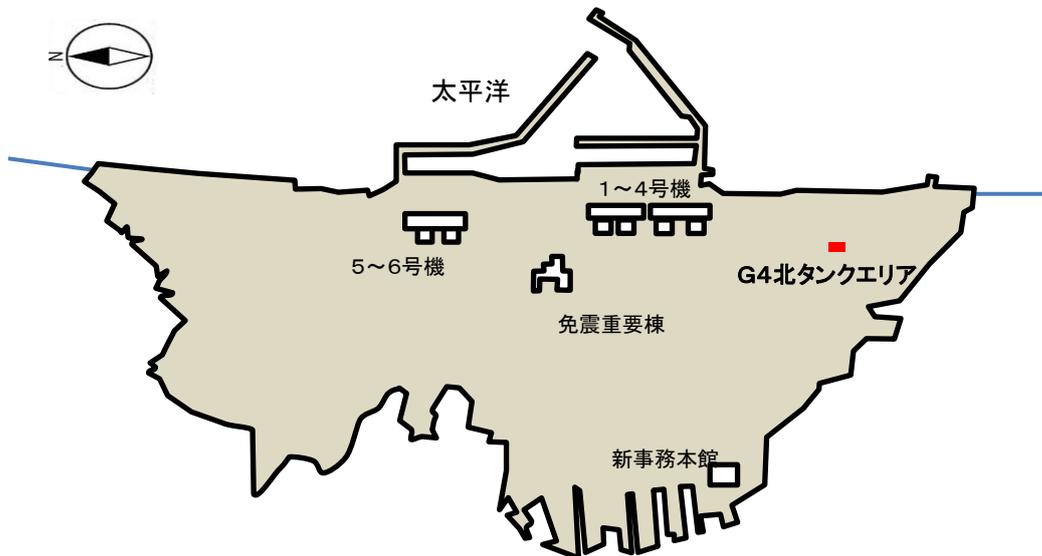

（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1)
G4北タンクエリア外観
(南西側から撮影)



(写真2-1)
移送配管撤去前の状況
(平成29年12月27日撮影)



(写真2-2)
移送配管撤去後の状況
(今回(令和元年12月9日)撮影)



(写真2-3)
止切弁の閉止状況



(写真3)
タンク連結管撤去後の状況

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。
