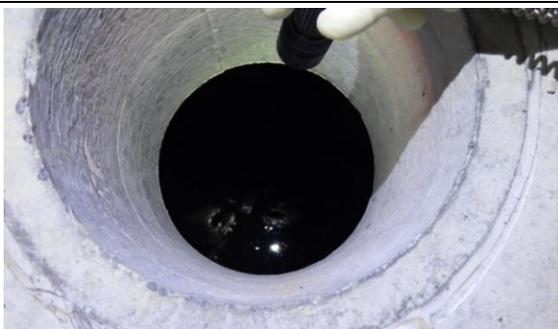


ALPS 処理水希釈放出設備 現地確認結果 報告書(概要)

確認年月日	令和5年8月22日(月)	確認目的	希釈後ALPS処理水サンプリングへの立会	
確認箇所	放水立坑(上流水槽)			
確認設備	<input type="checkbox"/> 測定・確認用設備	<input type="checkbox"/> 移送設備	<input checked="" type="checkbox"/> 希釈設備	<input type="checkbox"/> その他
確認結果	<p>ALPS処理水の海洋放出前にALPS処理水が想定通り希釈できていることを確認するために、希釈後のALPS処理水を放水立坑(上流水槽)に貯め、試料採取・分析することから、その状況を確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 試料採取には、IAEA、原子力規制庁、資源エネルギー庁が立ち会った。 ・ 海水により希釈されたALPS処理水を測定するため、放水立坑から直接汲み上げて試料採取していた。(写真1) ・ 採取した試料は、7Lになり、東京電力、JAEA、IAEAの3機関で分析するため、各容器に分けられた。(写真2) 			
				
	(写真1-1) 上流水槽の採取孔		(写真1-2) 上流水槽の採取孔	
				
	(写真1-3) 試料採取の状況		(写真2) 試料採取完了後の状況	
