

国道252号 出逢橋 流失に係る

南会津地方対策本部会議 【第3回】

資 料

令和7年7月25日

福島県南会津建設事務所


※『出逢橋』の「逢」の漢字は、正しくは「1点しんにょう」

【説明の流れ】

1. 交通開放の見通し
2. 仮道工の状況
3. 冬期間の雪崩対策
4. 流失橋の状況
5. 今後の予定

1. 交通開放の見通し

至 新潟県

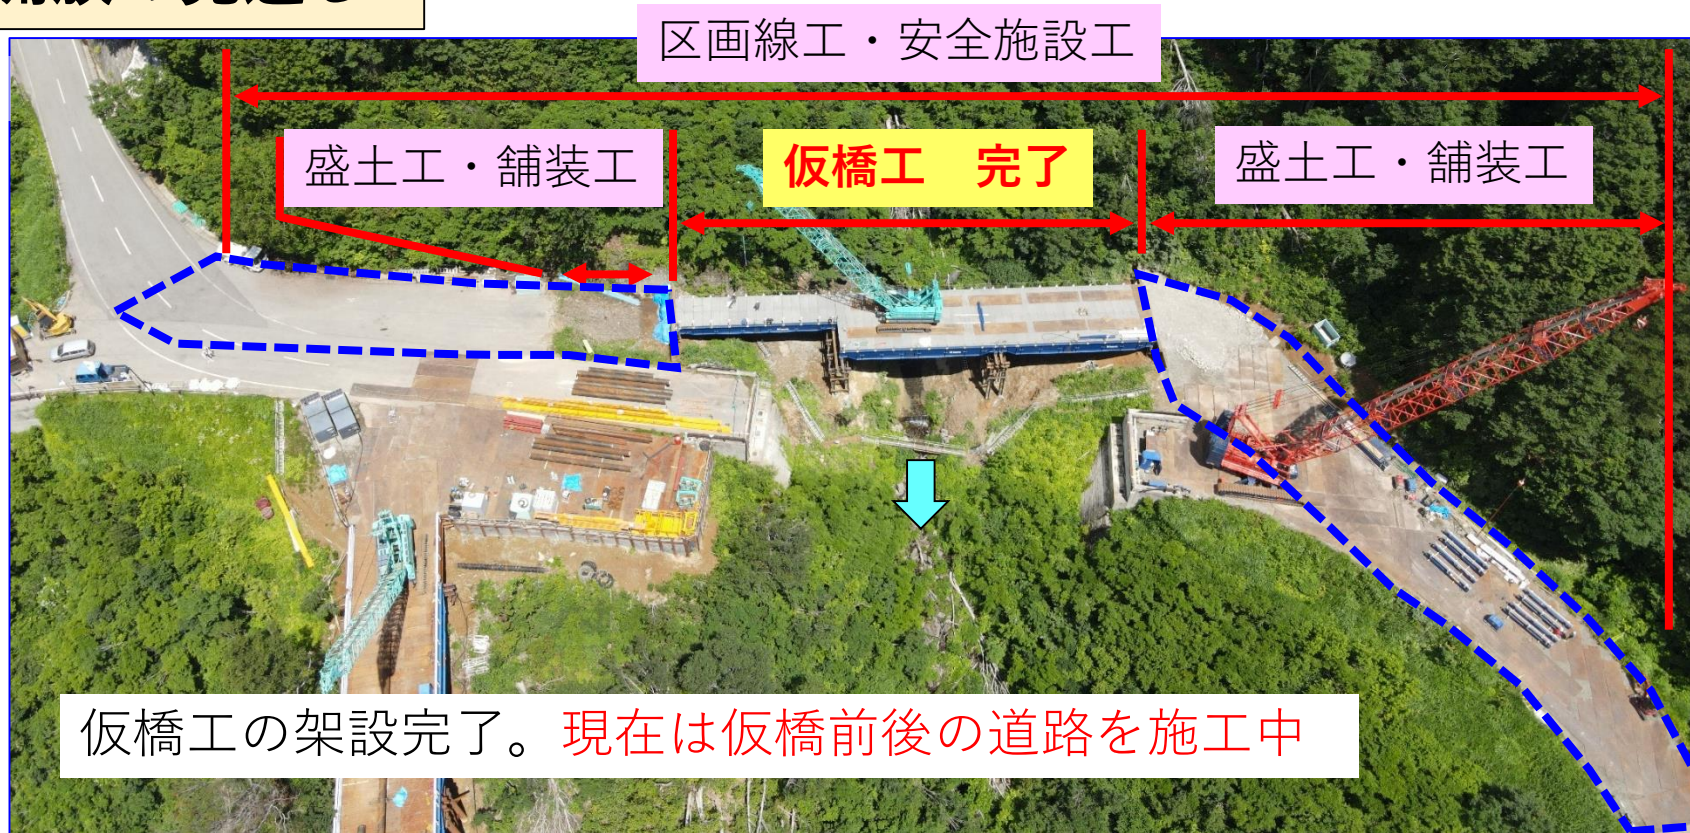

R7.7.16撮影

仮橋工の架設完了。現在は仮橋前後の道路を施工中

至 只見町

【残工事】

- ・ 仮橋前後の道路構築（改良・舗装工）
- ・ 区画線工
- ・ 安全施設工（ガードレール、矢羽根等）

お盆前に交通開放(片側交互通行)の見通し


2. 仮道工の状況

出逢橋仮道工 現況写真（1 / 2）

R7.7.22撮影



仮橋工の架設完了

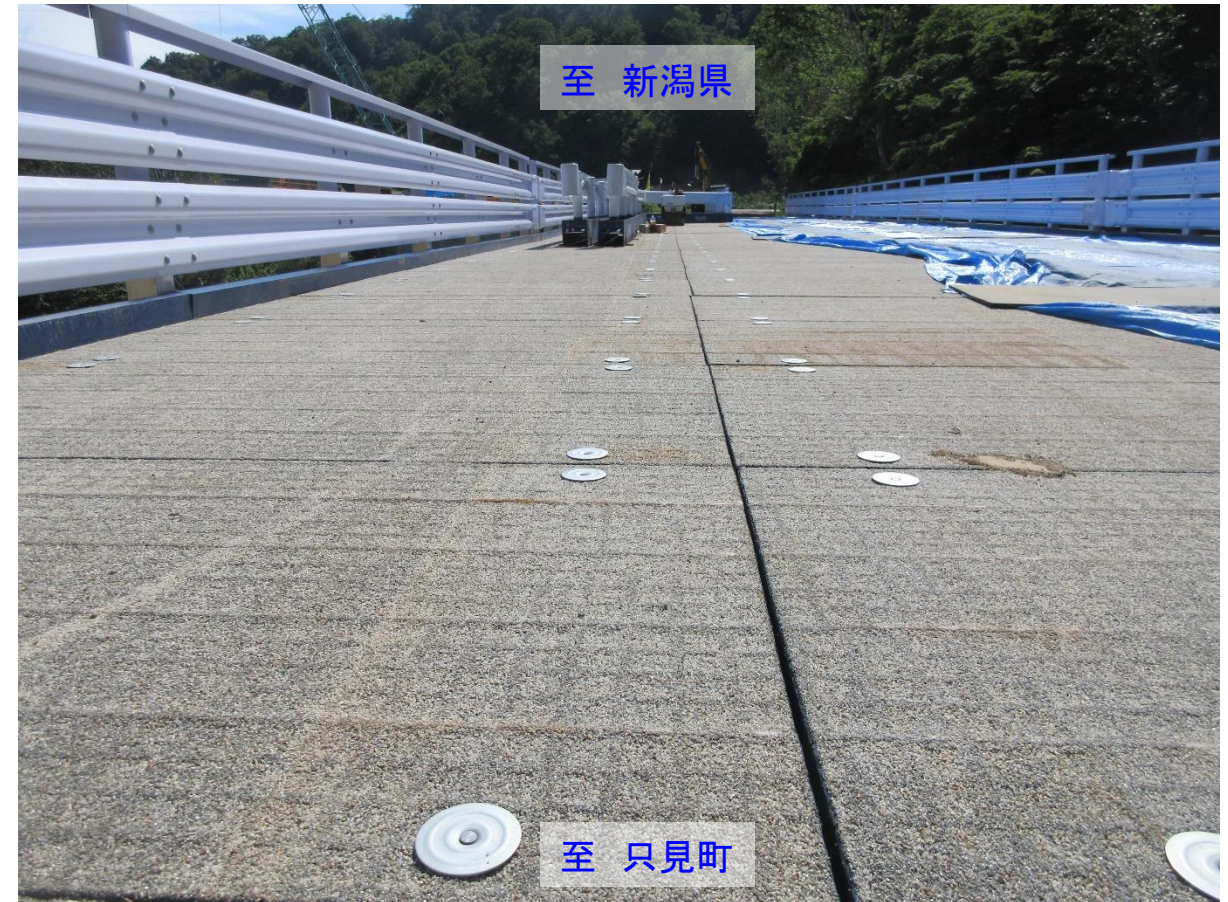


仮橋の表面はノンスリップ加工


2. 仮道工の状況

出逢橋仮道工 現況写真 (2 / 2)

R7.7.22撮影

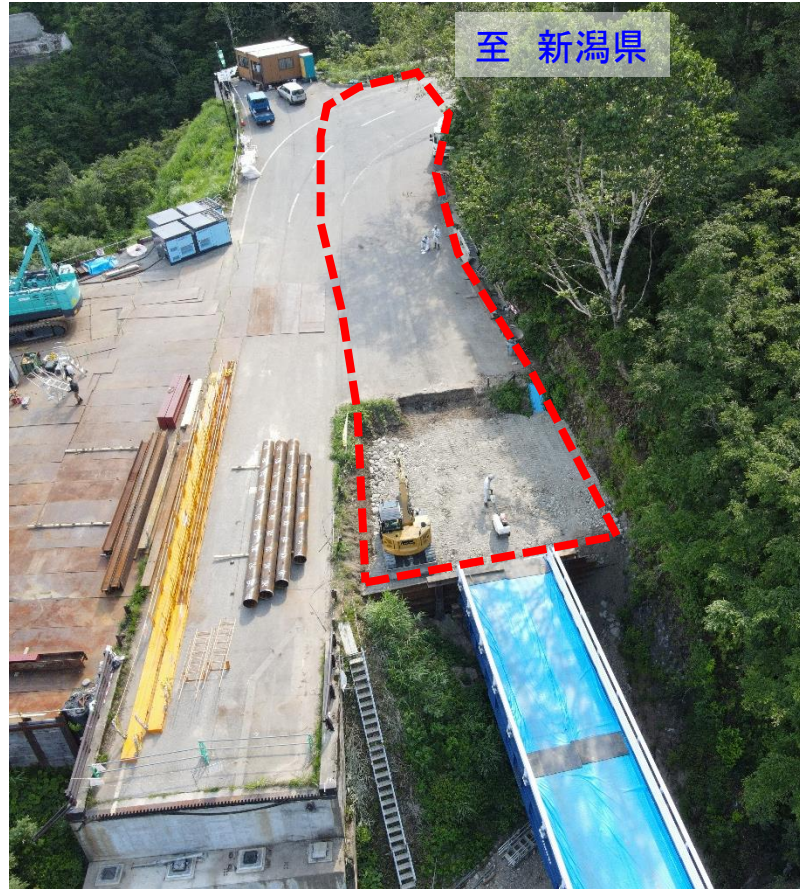

新潟側の状況

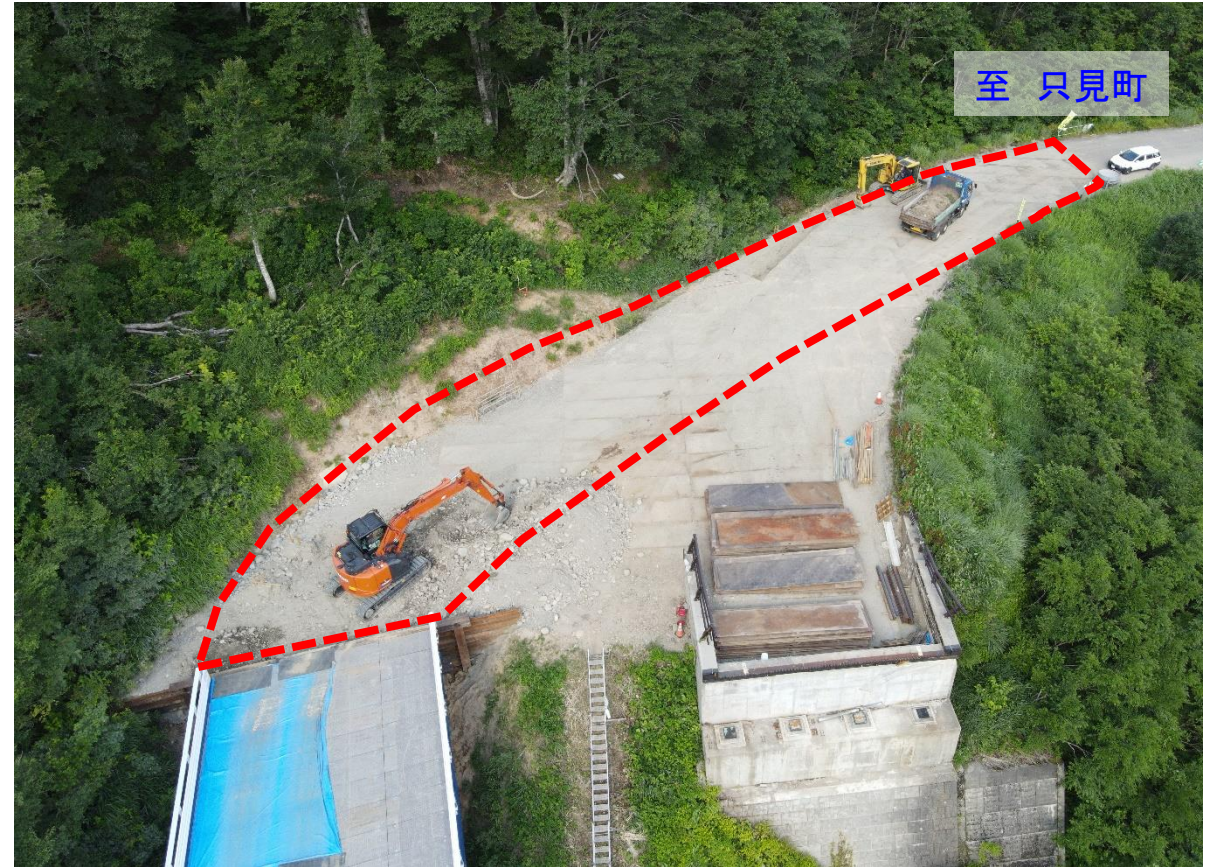

只見側の状況

改良・舗装工、区画線工、安全施設工が残工事として残る

3. 冬期間の雪崩対策（1 / 2）

R7.7.16撮影



仮橋については冬期間の**雪崩による再度災害を防ぐ観点から冬期間は撤去する**
※写真の赤破線部分を冬期間撤去、春に再設置

3. 冬期間の雪崩対策（ 2 / 2 ）

【今後の通行止・再開通の見通し】

・ 仮橋の撤去と再設置があるため、例年の冬期通行止期間よりも長く通行止めとなる



4. 流失橋の状況

流失した 出逢橋

R7.7.16撮影



出逢橋から概ね250m下流の沢合流部で発見



桁の変形はあるものの、
原形を残した状態で発見
今後、撤去方法等について
関係機関と協議予定

5. 今後の予定

<第1回会議>	4月14日	被災状況の報告
<第2回会議>	5月27日	復旧方法を公表
<第3回会議>	7月25日	開放見通しを公表【本日】
	8月上旬	交通開放日時を公表 (片側交互通行)

- ・ 会議は開催せずに、構成員の方へは文書にてお知らせします
- ・ 報道機関へは、記者発表によりお知らせします

※南会津地方対策本部会議は、交通開放をもって解散します
