

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

令和8年4月7日（火）

### 2 確認箇所

J8タンクエリア周辺

### 3 確認項目


J8タンクエリアの解体作業状況

### 4 確認結果の概要

A L P S 処理水等のうち、処理途上水を貯留していた J 8 タンクエリアは、3号機の燃料デブリ取り出し関連施設の建設が予定されているため、令和8年1月20日からタンクの解体作業が開始されている。

本日は、作業の進捗状況、タンク解体片の保管状況及び現場の安全管理状況を確認した。（前回確認：[令和8年2月10日](#)）

- ・ J 8 タンクエリアでは9基中4基のタンク解体が完了していた。現在、5基目の解体中であり、側板の切断作業が進行していた。（写真1）
- ・ J 8 タンクエリア北側のヤードは、天蓋、側板、底板、梯子等の解体片をさらに細断する作業エリアとなっていた。当日はグラインダーを使用した側板の解体が行われていた。また、ヤード近くには解体片が仮置きされていた。（写真2）
- ・ 現物の安全管理状況については、養生シートに穴、隙間が無く、問題なく展張されていることを確認した。また、火気作業（ガス切断）に関しても、消火用具が適切に配備され、ガスボンベ（水素+エチレン混合ガス）の取扱いについても問題がないことを確認した。（写真3）

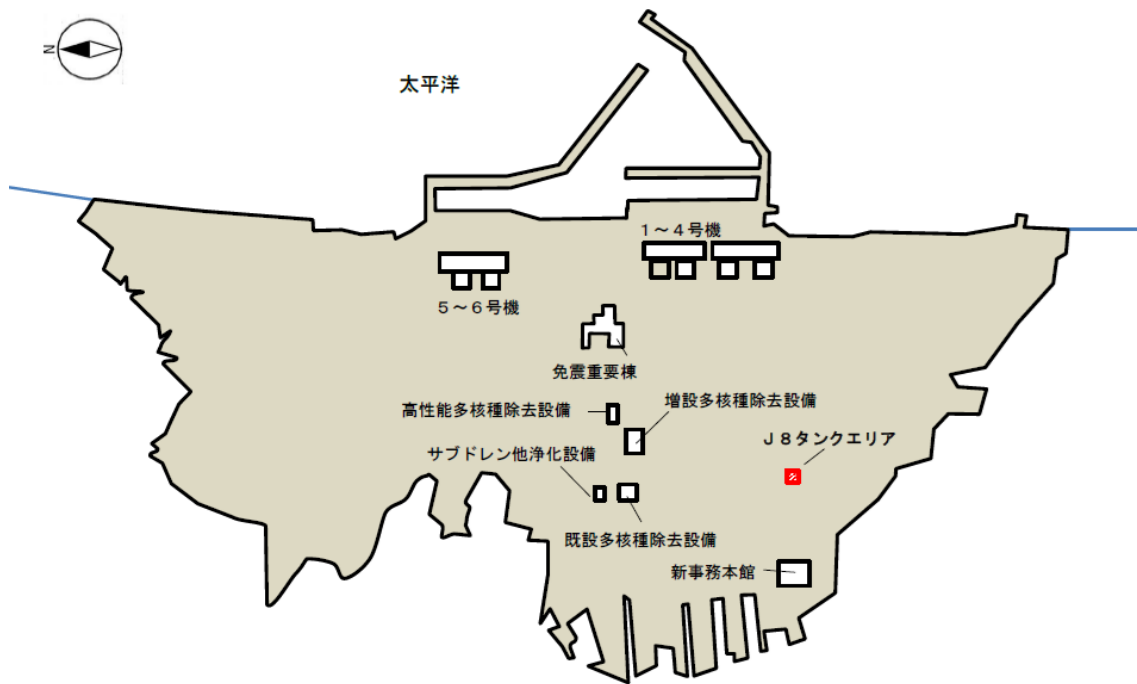

(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)  
J8タンクエリアの状況 (西側から撮影)



(写真1-2)  
J8タンクエリアの状況 (北西側から撮影)



(写真 1 - 3)  
側板の解体状況①



(写真 1 - 4)  
側板の解体状況②



(写真 2 - 1)  
解体片細断の状況



(写真 2 - 2)  
解体片保管状況



(写真3-1)  
養生シート設置状況



(写真3-2)  
消火器設置状況



(写真3-3)  
消火バケツ設置状況



(写真3-4)  
ガスポンペ設置状況

## 5 プラント関連パラメータ等確認

本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。
