平成29年2月末現在

福島駅前通り工事進捗状況

事業概要

路線名　福島停車場線（福島駅前通り）　福島県福島市栄町地内
延　長　L＝230m
幅　員　W＝約6．0（20．0）m
内　容　現況道路幅員の中で歩道、車道等を再配置します。車道は2車線を確保し型押しアスファルト舗装、歩道は 拡幅し、インターロッキングブロック舗装とします。
工　期　平成28年11月～平成30年3月（予定）

施工箇所図



現場状況写真

①平成29年2月1日現在

平成29年2月末現在

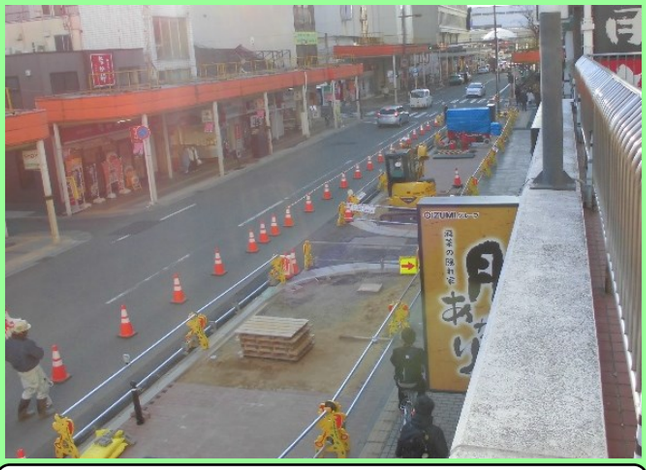

北3ブロックの歩道インターロッキングブロックの設置を行っています。

②北3ブロック工事着手前（平成28年9月21日撮影）

平成29年2月末現在

北3ブロックの歩道インターロッキングブロックの設置を行っています。

3月の施工予定

北3ブロックの歩道ブロック設置、北4ブロック未施工箇所の車道側溝設置、歩道ブロック設置、南4ブロックの既設街路灯撤去、街路樹の伐根、車道側溝設置を行います。
